



## EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALCOY

# INFORME DE LOS TRABAJOS PLANIFICADOS EN RED DE ALCANTARILLADO Y ESTACIONES DE BOMBEO Y DEPURACIÓN DE RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE ALCOY

Marzo-2020/ mayo-2020

*INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO MAR.20/MAY.20*



1.- ANTECEDENTES .....	4
2.- PLANIFICACIÓN ESTABLECIDA.....	4
3.- SITUACIÓN ACTUAL.....	9
3.1.- REVISIÓN DE IMBORNALES .....	9
3.2.- REVISIÓN DE GALERIAS VISITABLES.....	11
3.4.- REVISIÓN DE EBAR'S .....	12
3.5.- REVISIÓN DE EDAR'S.....	13
3.6.- REVISIÓN INCIDENCIAS VARIAS .....	14
3.7.- TRABAJOS DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO .....	15
3.7.1.-Acometidas asimilables a particulares .....	15
3.7.2.-Aliviadero Puente Cervantes:.....	16
3.7.3.-Juzgados-San Miguel: .....	16
3.7.4.-Obstrucciones en Albergue canino.....	17
3.7.5.- C/. Carmen Vidal .....	17
3.7.6.- Fuga en Colector Parque Zona Norte.....	18
3.7.7.- Insonorizado de tapas de alcantarillado.....	18
3.7.8.- Limpieza desagües fuentes ornamentales y públicas .....	19
3.7.9.- Limpieza imbornales parques y colegios municipales .....	19
3.7.10.- Cauce del rio .....	20
3.7.11.- Deficiencias varias para su valoración .....	20
3.7.12.- Trabajos por empresa especializada externa .....	21
3.7.13.- Trabajos relacionados con el Covid-19 .....	22
<b>3.8.- TRABAJOS DE INSPECCIÓN CON CÁMARA .....</b>	<b>22</b>
4.1.- IMBORNALES .....	23
4.2.- GALERÍAS VISITABLES.....	23
4.3.- PUNTOS CONFLICTIVOS .....	24
4.4.- POZOS .....	25
5.- RESIDUOS GENERADOS.....	26
6.- EPISODIOS DE FUERTES PRECIPITACIONES:.....	27
7.- PROPUESTAS DE MEJORA .....	28
8.- INFORMACIÓN DE INTERÉS.....	29
9.- ANEXOS ANALÍTICAS EDAR FONT ROJA Y ALBERGUE CANINO .....	30
10. ANEXOS COMUNICACIONES TRABAJOS SEMANALES .....	30

## RESUMEN INFORME MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO

**Periodo: MARZO 2020 – MAYO 2020**

Durante este periodo, se ha actuado en la totalidad de la zona Norte y Santa Rosa, incluido el Polígono Industrial de Cotes Baixes y Cotes Altes además de todos sus puentes, puntos críticos y tramos concretos de puntos por avisos varios, interviniendo en un total de **1.300 imbornales y 1.010 pozos, detectándose 114 incidencias en los imbornales**, habiéndose generado y tratado, **200 kg de residuos sólidos**. Por lo tanto, se ha realizado la totalidad de dos de los barrios del municipio de Alcoy y dos de sus cuatro Polígonos industriales incluida la revisión y limpieza de sus parques. También se ha procedido a limpiar parcialmente algunos tramos puntuales de galerías visitables.

Se han realizado las revisiones programadas de la EDAR Font Roja y Albergue Canino y EBAR Xorrador.

Se han realizado **47 intervenciones**, en distintos puntos de la red de alcantarillado, por avisos de ciudadanos a través del canal de la Línea Verde u otros canales, estando revisadas el 100% de las incidencias comunicadas, quedando a fecha de hoy 0% pendientes.

Durante este periodo, se han realizado diferentes inspecciones con cámara (robot y cámara pértiga) en la red de alcantarillado de Alcoy tanto planificadas como debido a incidencias, habiéndose **inspeccionado un total de 1.138 metros** de red de alcantarillado.

Se ha superado en la semana 12, 14, 16 y 17 (alerta amarilla), episodios de fuertes lluvias y tormentas sin incidencias relevantes, lo que demuestra la calidad y eficiencia de los trabajos de mantenimiento, realizados en la red de saneamiento. Existe para ello un Protocolo de actuación en caso de alertas por episodios de fuertes lluvias.

Se dispone de AUTORIZACIÓN de descarga de residuos en las diferentes EDAR públicas de la Comunidad Valenciana por parte de la EPSAR habiendo sido utilizado en varias ocasiones para su descarga.

Podemos mejorar el funcionamiento de la red de saneamiento, haciendo llegar a los usuarios un mensaje de: concienciación ciudadana y del sector de restauración para evitar vertido de aceites y grasas al alcantarillado.

INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO MAR.20/MAY.20



## 1.- ANTECEDENTES

El presente informe periódico surge ante la solicitud por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de Alcoy a través del Departamento de Inspección General de Servicios, según Pliego, de los trabajos planificados en la red de alcantarillado y estaciones de bombeo y residuales en el municipio de Alcoy

En dicho informe se recogen una serie de actuaciones planificadas en dicha red, tanto en revisión de imbornales, revisión de galerías visitables, revisión de pozos, estaciones de bombeo y residuales y actuaciones puntuales según avisos de Línea Verde o a petición del Ayuntamiento a través del departamento de I.G.S. En este caso desde los meses de **marzo de 2020 a mayo de 2020**

Aparecen también una serie de mejoras que pueden contribuir a dar un paso más allá para la óptima gestión del Servicio Municipal de Alcantarillado de Alcoy.

A continuación se presentará una breve descripción de las actuaciones para que se establezca la viabilidad y prioridad de su ejecución y la financiación necesaria.

## 2.- PLANIFICACIÓN ESTABLECIDA

A continuación adjuntamos planificación establecida tanto para para la revisión de la red de alcantarillado como para las estaciones de bombeo (EBAR) y depuración de residuales (EDAR).

INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO MAR.20/MAY.20











### 3.- SITUACIÓN ACTUAL

A continuación detallamos los trabajos realizados entre los meses de **marzo de 2020 a mayo de 2020** en todas las instalaciones:

#### 3.1.- REVISIÓN DE IMBORNALES

Entre las fechas indicadas se han revisado un total de **1.300 imbornales** habiéndose realizado:

- Zona Pol. Ind. Cotes Baixes
- Zona Norte
- Zona Pol. Ind. Cotes Altes
- Zona Santa Rosa
- Todos sus puentes
- Punto críticos


Paralelamente se procede a la revisión y limpieza de:

- Todos los parques de las diferentes zonas
- Entorno Fuentes Ornamentales

Adjuntamos cronograma de la situación de la revisión de imbornales en este periodo de tiempo:

INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO MAR.20/MAY.20



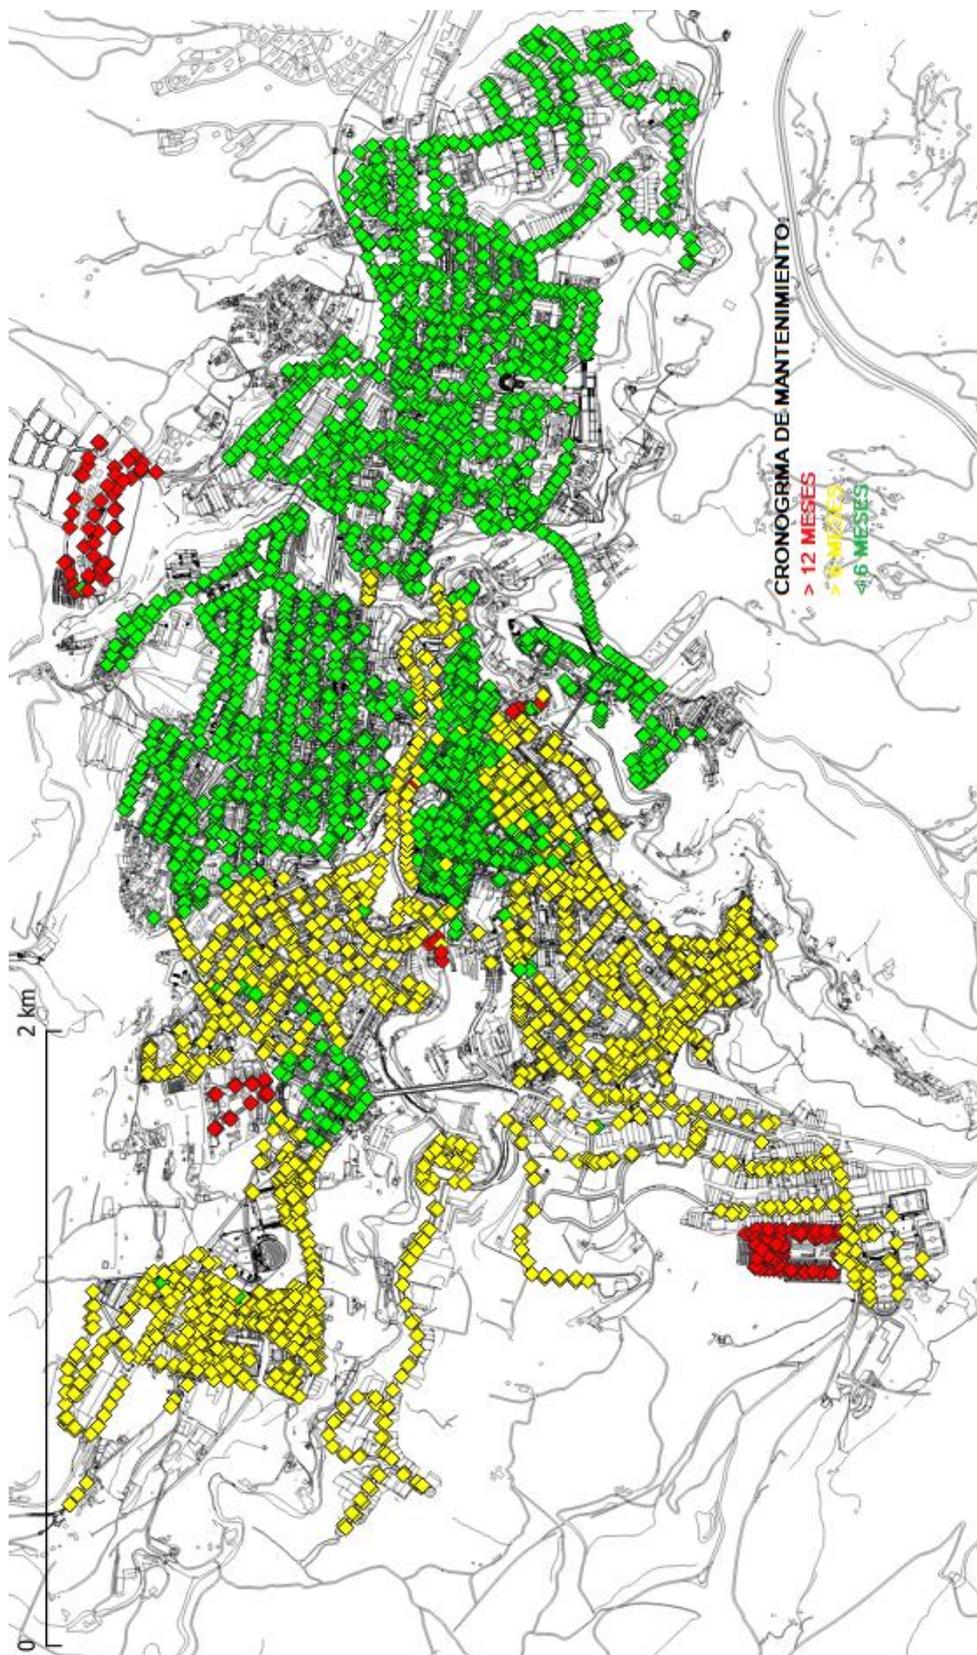

INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO MAR.20/MAY.20



Ej. Revisión y limpieza imbornal

### 3.2.- REVISIÓN DE GALERIAS VISITABLES

Entre las fechas indicadas y debido a las circunstancias del confinamiento no se ha podido realizar la revisión de galerías dentro de la planificación establecida. Tan solo alguna emergencia (Oliver y Rigoberto Albors, San Domenech)




Ej. Galería visitable

INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO MAR.20/MAY.20

### 3.3.- REVISIÓN DE POZOS

Entre las fechas indicadas se han revisado un total de **1.010 pozos** de las mismas zonas indicadas en el apartado de imbornales incluidos parques y jardines.

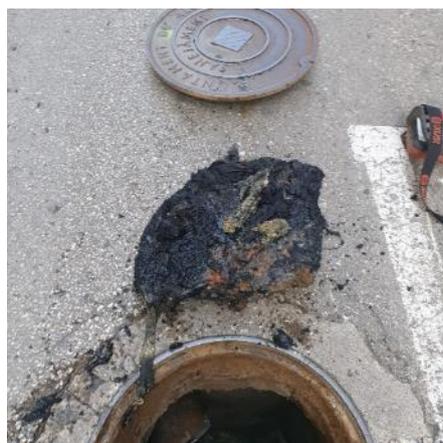

Ej. Revisión y limpieza pozo. Extracción trozos tapas

### 3.4.- REVISIÓN DE EBAR'S

Se ha realizado la revisión de la EBAR de Xorrador y Recinto Ferial, siguiendo la planificación establecida. Se han presentado informes de las anomalías y situación actual en caso necesario. Está prevista la instalación de la nueva bomba a lo largo del mes de junio.



EBAR Xorrador

*INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO MAR.20/MAY.20*

### 3.5.- REVISIÓN DE EDAR'S

Se ha realizado la revisión de las EDAR de Font Roja y Albergue Canino siguiendo la planificación establecida. Se han presentado informes de las anomalías y situación actual en caso necesario.

#### 3.5.1 EDAR ALBERGUE CANINO:

- Se continúa reclamando la presencia de residuo sólido aunque se ha reducido mucho el número de pelotas y juguetes de animales. Se han instalado rejillas en alguno de los desagües para evitar la entrada de pelotas y otros juguetes de los animales pero no en su totalidad.



Retirada manual residuos en labor de mantenimiento

INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO MAR.20/MAY.20

### 3.5.1 EDAR FONT ROJA:

- Se está barajando la posibilidad de sustituir los cepillos del tornillo para mejorar la recogida de gruesos. Los parámetros analizados continúan estando dentro de las exigencias establecidas por Confederación.



Revisión EDAR Font Roja

### 3.6.- REVISIÓN INCIDENCIAS VARIAS

Entre las fechas indicadas se han revisado un total de **47 incidencias** de línea verde o por otro medio de aviso, de las cuales han sido solucionadas y por lo tanto cerradas todas ellas, quedando un 0% pendientes.

INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO MAR.20/MAY.20

### 3.7.- TRABAJOS DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO

Se han realizado trabajos de colaboración con el Ayuntamiento en varias incidencias entre ellas las que citamos a continuación por su relevancia:

#### 3.7.1.-Acometidas asimilables a particulares

Se ha realizado la revisión de la red de alcantarillado de varias acometidas particulares para descartar cualquier incidencia que sea responsabilidad de la red de alcantarillado del municipio de Alcoi (Ejem: C/. Caseta Mascarells, C/. Piló, C/. Alicante y Doña Amalia, C/. Pare Poveda, Plaza Les Xiques, Ctra Molinar, Pasaje Merita, C/. Camí, C/. San Juan, C/. Aitana, C/. B Pol. Cotes Baixes, C/. Carrascar, C/. Casablanca, Galería Rigoberto Albors



Ejem: Acometida particular

### 3.7.2.-Aliviadero Puente Cervantes:

Debido a las últimas lluvias el pozo ha sido de nuevo arrastrado por lo que debe ser nuevamente reconstruido. Se realizan revisiones periódicas en colaboración con el Ayuntamiento.



Estado actual del pozo

### 3.7.3.-Juzgados-San Miguel:

Se han realizado nuevas averiguaciones incluido revisión, limpieza e inspección visual de la zona afectada.



INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO MAR.20/MAY.20

### 3.7.4.-Obstrucciones en Albergue canino

Se continúa actuado en el desatasco de las dependencias municipales del Albergue Canino, reclamando cada vez que se deben recoger los gruesos e instalar rejillas en la totalidad de los desagües por parte del personal responsable para evitar embozos y desperfectos en la noria de desbaste de gruesos



Ejem. Detalle de rejilla instalada pero levantada

### 3.7.5.- C/. Carmen Vidal

Se ha actuado en varias ocasiones en colaboración con las brigadas municipales para resolver un problema en los desagües de esta instalación teniendo previsto ejecutar una obra de instalación de un imbornal corrido para evitar encharcamientos



INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO MAR.20/MAY.20

### 3.7.6.- Fuga en Colector Parque Zona Norte

Realizada Obra de colectores de Zona norte.



### 3.7.7.- Insonorizado de tapas de alcantarillado

Se han ido insonorizando un total de 5 diferentes tapas de alcantarillado en este periodo, que debido a su instalación hacen ruido por el tráfico rodado. Se está probando con diferentes sistemas de insonorización entre ellos el de un polímero sellador que está dando buen resultado ya que es resistente al corte, con gran poder adhesivo y de buena elasticidad



INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO MAR.20/MAY.20

### 3.7.8.- Limpieza desagües fuentes ornamentales y públicas

Se ha realizado la revisión y limpieza de fuentes públicas



Revisión y limpieza fuentes públicas


### 3.7.9.- Limpieza imbornales parques y colegios municipales

Se ha realizado la revisión y limpieza de todos los parques de la Zona planificada de forma más minuciosa y siguiendo la planificación establecida.



Trabajos de desatasco Imbornal corrido en parque

INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO MAR.20/MAY.20

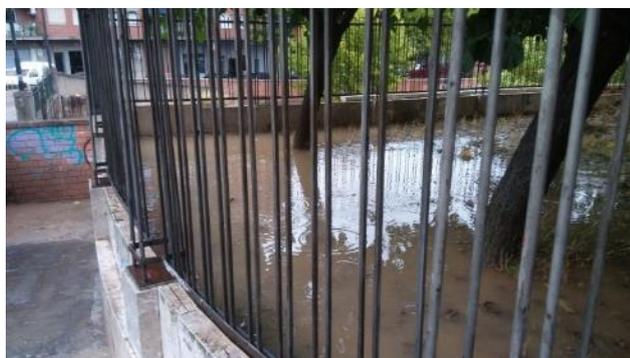

Colegio Romeral

### **3.7.10.- Cauce del rio**

Se ha colaborado con el Ayuntamiento y la EDAR en la revisión de diferentes tramos del río por posibles vertidos



### **3.7.11.- Deficiencias varias para su valoración**

Se ha colaborado con el Ayuntamiento en la revisión, limpieza e inspección con cámara de varios tramos de la red de alcantarillado de distintos puntos de la población para su valoración y posterior reparación. Ejem: C/. Escultor Peresejo, C/. Carmen Vidal, C/. Pare Poveda, C/. Gregorio Casasempere, Barrio San Pancraccio, Rotonda Sur, C/. San Pau y San Pere, C/. Santo Tomás, C/. Terrasa, C/. San Francisco, Serelles, Pol. Industrial Jacarilla, etc...

*INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO MAR.20/MAY.20*



Desprendimiento en red alcantarillado C/. Gregorio C. Juan

### **3.7.12.- Trabajos por empresa especializada externa**

Se ha colaborado con el Ayuntamiento en la revisión y limpieza de puntos que tienen deficiencias en su interior y que debido a la complejidad de los trabajos se ha requerido de una empresa especializada. De momento se ha realizado una primera intervención en la que se han resuelto deficiencias en Ctra. Molinar, San Nicolauet y Cordeta



Desprendimientos C/. Cordeta

### 3.7.13.- Trabajos relacionados con el Covid-19

Se ha colaborado con el Ayto de Alcoy e la instalación de una serie de New Jersey para poder ensanchar las aceras de la Avda. Camilo Sesto



### 3.8.- TRABAJOS DE INSPECCIÓN CON CÁMARA

A lo largo de estos meses se han realizado diferentes inspecciones en la red de alcantarillado de Alcoy tanto planificadas como debido a incidencias habiéndose inspeccionado un total de **1.138 m de red de alcantarillado**.



INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO MAR.20/MAY.20

#### 4.- INCIDENCIAS DETECTADAS

##### 4.1.- IMBORNALES

INCIDENCIA	Nº IMBORNALES AFECTADOS	OBSERVACIONES
ACOMETIDA RAICES	1	
ACOMETIDA ROTA	4	
ACOM. TAPON/NO CONECT	7	
CAJA DEFECTUOSA	0	
COMPROBAR GIS	10	No existen
ACOMETIDA ANULADA	0	
MARCO ROTO	0	
MARCO SUELTO	24	
SIFON HORMIGONADO	0	
SIFON ROTO	55	
SIFON SIN TAPA	0	
TAPA ROTA	2	
TAPA SIN	0	Sustituidas varias tapas de imbornales o mejoradas. Inventario almacén municipal realizado y entregado a Resp. Municipal. Avisadas a Ayto
TAPA SOLDADA	3	
TAPADO ASFALTO	5	
ACOM. DESAGUE REDUCIDO	1	
SIN ACCESO	2	Pte. Limpieza por diferentes motivos

##### 4.2.- GALERÍAS VISITABLES

Siguen estando en fase de resolución por parte del Ayuntamiento, las anomalías en las galerías visitables revisadas y anotadas en anteriores informes, ya que pueden suponer un posible riesgo para la seguridad del personal de mantenimiento y además dificultan las labores de revisión.

*INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO MAR.20/MAY.20*

En líneas generales adjuntamos las deficiencias más relevantes de los tramos revisados en este periodo de tiempo:

- C/ Perú: Falta de muchas tapas de cableado eléctrico
- C/ Isaac Peral: Restos de tuberías
- C/ Av. Alameda: Tapas de metal oxidadas y podridas y de hormigón con agujeros, mucho escombros,
- C/ Joan Valls: Restos de tuberías.
- C/ B Cotes Baixes: Sin alumbrado, canaletas de cableado sueltas, grietas y fisuras
- C/ M.J.R.Montes: Restos de tuberías, restos de metales y un carro, faltan canaletas de cableado, alumbrado fuera de servicio, faltan tapas alcantarillado, restos de maderas.
- Arsenal: tendido eléctrico sujetado con maderas, restos de tuberías PVC, focos sin tapa, restos de codos



Ejemplo de defecto en galería. Falta tapa cableado

#### 4.3.- PUNTOS CONFLICTIVOS

Actualmente en líneas generales debemos destacar de los tramos revisados:

INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO MAR.20/MAY.20

- **Galería Oliver:** Debido al gran número de anomalías encontradas se ha realizado un informe de la misma para presentación al Ayuntamiento. Su limpieza está en proceso a fecha de hoy por su complejidad y peligro.
- **C/. Azorín:** Hundimiento del pozo
- **C/. Cid con Lluís Braille:** Hundimiento del pozo
- **C/. Tints – Isabel Católica:** Supuesto vertido
- **Cami Murtera:** Vertido directo al terreno
- **Parque Romeral:** Desagüe mal diseñado que provoca encharcamiento
- **Parque Viaducto:** La mayoría de los imbornales están obstruidos por raíces
- **Colegio Paulas:** Imbornal infradimensionado
- **C/. Gregorio Casasempere Juan:** Hundimiento de pozo

Se dispone de un listado más detallado de los puntos conflictivos que consideramos deben ser reparados con un orden de prioridad contrastados y revisados por el responsable del Ayuntamiento

#### 4.4.- POZOS

A lo largo de estos meses, al igual que el periodo anterior, se observa en algunos casos gran cantidad de raíces, marcos sueltos o a los que les falta material y desprendimientos pero en general están en bastante buen estado de conservación. Destacar en algunos casos haber encontrado gran cantidad de grasas y toallitas.

En este periodo se continúan detectando pozos con trozos de tapas de alcantarillado rotas dentro de los mismos y grandes cascotes desprendidos, lo que impide la circulación de las aguas residuales con normalidad.

INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO MAR.20/MAY.20





Pozo con gran cantidad de grasas

También siguen encontrando pozos en los que se han depositado materiales de construcción como hormigón que supuestamente han sido tirados al finalizar alguna obra. Estos materiales provocan que la red de alcantarillado entre en carga parcial y los lodos pueden llegar a obstruir por completo la tubería.



## **5.- RESIDUOS GENERADOS**

Añadimos este punto en el informe ya que consideramos que es muy representativo para entender el estado en el que se encuentran todos los elementos de la red de alcantarillado.

INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO MAR.20/MAY.20

En este periodo, se han generado una totalidad de **200 Kg de residuos sólidos** que han sido depositados en su totalidad y de forma controlada en el Ecoparque Municipal, residuos en cantidad muy inferior a otros periodos, lo que nos da a entender que el esfuerzo realizado en otros periodos ha sido efectivo.



Detalle de descarga de gran cantidad de residuos

#### **6.- EPISODIOS DE FUERTES PRECIPITACIONES:**

Queremos destacar que en los episodios de precipitaciones ocurridos en el municipio entre marzo de 2020 y mayo de 2020, los días:

- Semana 12/2020 (episodio de lluvia alerta amarilla)
- Semana 14/2020 (episodio de lluvia alerta amarilla)
- Semana 16/2020 (episodio de lluvia alerta amarilla)
- Semana 17/2020 (episodio de lluvia alerta amarilla)
- Semana 22/2020 (episodio de lluvia alerta amarilla)

No se ha producido ninguna incidencia de relevancia, no habiendo recibido ningún aviso por parte de la administración ni servicio de emergencias en el cual hayamos tenido que actuar.

INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO MAR.20/MAY.20

Se dispone de un Protocolo de actuación en caso de alertas por fuertes lluvias, en el que hay diseñado un procedimiento a seguir y un listado de puntos críticos que deben ser revisados con la máxima anterioridad para evitar al máximo los posibles daños o molestias a los ciudadanos afectados.

Territori	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI
Província d'Alacant					
<b>l'Alcoià</b>					
○ Alcoi Baradello	..	2,6	123,2	86,4	56,7
● Alcoi ACIF	223,6	2,4	97,4	61,4	49,0
● Alcoi la Penella d'Ànima	207,5	3,2	99,2	83,0	48,2
● Alcoi Pas del Benissaidó	303,2	2,6	95,4	69,4	52,2
○ Alcoi sant Nicolau	..	..	..	..	47,1
● Alcoi Menejador	270,6	3,6	119,6	60,8	41,4
○ Alcoi Santa Rosa	239,5	1,9	77,5	54,8	49,9
● Alcoi Est. Científica Font Roja Natura UA	122,0	2,8	..	..	49,6
● Alcoi IES Pare Vitòria	190,8	1,6	75,2	46,8	40,8
○ Alcoi PI Cotes Baixes AEMET	261,6	1,6	78,8	80,2	42,0

Fuente: <https://www.avamet.org/mx-episodis.php>

## **7.- PROPUESTAS DE MEJORA**

Consideramos necesario realizar una serie de actuaciones para mejorar el servicio de alcantarillado las cuales detallamos a continuación entre otras.

- Campaña de concienciación ciudadana para evitar tirar toallitas, compresas, guantes y mascarillas al WC
- Campaña de concienciación ciudadana y sector de restauración para evitar tirar exceso de aceites y grasas al alcantarillado
- Destacar en las licencias de obra que deben protegerse los imbornales y tapas de pozos para evitar que caigan materiales de construcción en las galerías.

INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO MAR.20/MAY.20



- Destacar en las licencias de obras que después de ejecutarse una obra que afecte al servicio de alcantarillado, debe realizarse una limpieza e inspección de la red para comprobar su buen estado de funcionamiento.
- Comunicar al responsable de la limpieza urbana que evite tirar cualquier resto en los imbornales para no obstruirlos.
- Comunicar al responsable de la limpieza urbana que en caso de Alerta o Prealerta por fuertes lluvias y sobretodo en las fechas en las que los árboles caducos pierden la hoja, se extreme la limpieza con antelación para evitar obstrucciones por hojas.
- Se debería estudiar la forma de prohibir el estacionamiento encima de pozos e imbornales para poder realizar las labores de revisión y limpieza sin dificultades
- Comunicar a la empresa de desratización que cuando levanten las tapas de pozos para colocar el veneno, deben de dejarlas en la misma posición y no quitar la goma de insonorización para evitar tener reclamaciones y trabajos posteriores para su reposición.

## **8.- INFORMACIÓN DE INTERÉS**

A pesar del elevado número de incidencias que se comunican y que deben ser atendidas con carácter prioritario, desatendiendo las labores de mantenimiento planificadas y que se ha tenido que atender a diferentes solicitudes fuera de planificación al considerarse prioritarias (Limpieza de desagües de fuentes ornamentales, limpieza de parques y jardines, limpieza de avenidas con gran complicación debido al tráfico, etc), los trabajos de mantenimiento de la red de alcantarillado se han ajustado bastante a la planificación establecida.

Según reunión mantenida con el responsable del Ayuntamiento y el Inspector de Policía Local, para agilizar los trabajos de revisión y limpieza de las calles del centro urbano y el resto de calles de un solo carril, se está pasando al

*INFORME TRABAJOS RED ALCANTARILLADO MAR.20/MAY.20*



departamento de Policía Local con copia al responsable del Ayuntamiento, mediante correo electrónico, una planificación semanal con todas las calles que se tiene previsto revisar y además se va a realizar una llamada al retén de Policía Local, antes y después de realizar la revisión.

Igualmente de forma semanal se realiza un resumen de los trabajos realizados para que en todo momento el personal responsable del Ayuntamiento esté informado de los avances y asuntos de interés.

Continuamos realizando una labor de revisión y limpieza exhaustiva para contribuir a una optimización del Servicio Municipal de Alcantarillado de Alcoi, mejorando su funcionamiento y evitando malestar a los ciudadanos.

Alcoi, junio 2020

## **9.- ANEXOS ANALÍTICAS EDAR FONT ROJA Y ALBERGUE CANINO**

Las analíticas se realizan de forma bimestral

## **10. ANEXOS COMUNICACIONES TRABAJOS SEMANALES**

Se adjuntan todos los partes semanales enviados al personal responsable del Ayuntamiento de Alcoi, vía correo electrónico.


Nº de Referencia:	<b>A-20/037544</b>	Registrada en:	AGQ España	Cliente(*):	UTE ALCANTARILLADO ALCOY
Análisis:	134861A-2	Centro Análisis:	AGQ España	Domicilio (*):	C/ Goya 5 PB
Tipo Muestra:	AGUA RESIDUAL	Fecha Recepción:	16/04/2020	Contrato:	SE20-0188
Fecha Inicio:	16/04/2020	Fecha Fin:	26/05/2020	Cliente 3º(*):	----
Descripción(*):	EDAR ALBERGUE CANINO				

Fecha/Hora Muestreo:	14/04/2020	Muestreado por:	Cliente (*)
----------------------	------------	-----------------	-------------

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.



Lorena Garcia Garcia

FECHA EMISIÓN: 27/05/2020

**OBSERVACIONES (\*):**

Muestra de volumen 3l. en bote de PET y 1l. en vidrio. Detergentes Catiónicos y Detergentes No Iónicos: ENAC Nº 229/LE1409

Nº de Referencia:	A-20/037544	Tipo Muestra:	AGUA RESIDUAL
Descripción(*):	EDAR ALBERGUE CANINO	Fecha Fin:	26/05/2020

**RESULTADOS ANALITICOS**

Parámetro	Resultado	Unidades	Incert	CMA
<b>Aniones -</b>				
Nitratos	10,8	mg/L	±10%	
<b>Parámetros Físico-Químicos</b>				
Aceites y Grasas	< 1,00	mg/L	±30%	
DBO5	6,99	mg/L O2	±27%	
Detergentes Anionicos	< 0,10	mg/L	±29%	
A Detergentes Cationicos	< 0,10	mg/L	±23%	
A Detergentes no Ionicos	< 2,00	mg/L	±17%	
* Detergentes Totales	< 0,10	mg/L	±40%	
DQO	22,0	mg/L O2	±14%	
pH	7,73		±5%	
Sólidos en Suspensión	15,7	mg/L	±31%	
<b>Formas Nitrogenadas/Fosforadas</b>				
Nitrógeno Kjeldahl	12,5	mg/L N	±25%	
Nitrógeno Total	15	mg/L	±27%	
<b>Cationes +</b>				
Amonio	11,9	mg/L	±13%	
<b>Aniones -</b>				
Cloruros	12,4	mg/L	±20%	
Sulfatos	7,94	mg/L	±20%	
<b>Metales Totales</b>				
*2 Boro Total	< 0,100	mg/L	-	
Fósforo Total	3,29	mg/L	±13%	

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos, marcados con (\*). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).

(2) Ensayo cubierto por la Acreditación nº TL-475 emitida por IAS.

Nº de Referencia: A-20/037544  
 Descripción(\*): EDAR ALBERGUE CANINO

Tipo Muestra: AGUA RESIDUAL  
 Fecha Fin: 26/05/2020

## ANEXO TECNICO

Parámetro	PNT	Técnica	Ref. Norma.	Rango
<b>Aniones -</b>				
Nitratos	PE-336	Analiz Flujo Segmentado		10,0 - 100.000 mg/L
<b>Parámetros Físico-Químicos</b>				
Aceites y Grasas	PE-296	Espect FTIR		1,00 - 5.000 mg/L
DBO5	PE-305	Electrometría		5,00 - 6.000 mg/L O2
Detergentes Anionicos	PE-310	Espect UV-VIS		0,10 - 200 mg/L
<sup>A</sup> Detergentes Cationicos	PS-1018	Subcontrat		0,10 - 150 mg/L
<sup>A</sup> Detergentes no Iónicos	PS-1018	Subcontrat		2,00 - 600 mg/L
* Detergentes Totales	PE-310	Espect UV-VIS		0,10 - 5.000 mg/L
DQO	PE-2032	Espect UV-VIS		20,0 - 5.000 mg/L O2
pH	PEC-001	Potenciometría pH		2,00 - 12,0
Sólidos en Suspensión	PE-307	Gravimetría		2,00 - 15.000 mg/L
<b>Formas Nitrogenadas/Fosforadas</b>				
Nitrógeno Kjeldahl	PE-341	Espect UV-VIS		5,00 - 1.000 mg/L N
Nitrógeno Total	PE-335	Anal. Elemental		5 - 10.000 mg/L
<b>Cationes +</b>				
Amonio	PE-336	Analiz Flujo Segmentado		5,00 - 5.000 mg/L
<b>Aniones -</b>				
Cloruros	PE-2090	Cromatog Iónica		0,50 - 100 mg/L
Sulfatos	PE-2090	Cromatog Iónica		0,50 - 100 mg/L
<b>Metales Totales</b>				
<sup>*2</sup> Boro Total	PE-2107	Espect ICP-OES		0,100 - 100 mg/L
Fósforo Total	PE-308	Espect ICP-OES		0,10 - 1.000 mg/L

Los parámetros marcados con asterisco (\*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación.


Nº de Referencia:	<b>A-20/037545</b>	Registrada en:	AGQ España	Cliente(*):	UTE ALCANTARILLADO ALCOY
Análisis:	134861A-2	Centro Análisis:	AGQ España	Domicilio (*):	C/ Goya 5 PB
Tipo Muestra:	AGUA RESIDUAL	Fecha Recepción:	16/04/2020	Contrato:	SE20-0188
Fecha Inicio:	16/04/2020	Fecha Fin:	26/05/2020	Cliente 3º(*):	----
Descripción(*):	EDAR FONT ROJA				

Fecha/Hora Muestreo:	14/04/2020	Muestreado por:	Cliente (*)
----------------------	------------	-----------------	-------------

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.



Lorena Garcia Garcia

FECHA EMISIÓN: 27/05/2020

**OBSERVACIONES (\*):**

Muestra de volumen 3l. en bote de PET y 1l. en vidrio. Detergentes Cationicos y Detergentes No Ionicos: ENAC Nº 229/LE1409

Nº de Referencia: A-20/037545  
 Descripción(\*): EDAR FONT ROJA

Tipo Muestra: AGUA RESIDUAL  
 Fecha Fin: 26/05/2020

**RESULTADOS ANALITICOS**

Parámetro	Resultado	Unidades	Incert	CMA
<b>Aniones -</b>				
Nitratos	< 10,0	mg/L	±10%	
<b>Parámetros Físico-Químicos</b>				
Aceites y Grasas	< 1,00	mg/L	±30%	
DBO5	< 5,00	mg/L O2	±27%	
Detergentes Anionicos	< 0,10	mg/L	±29%	
A Detergentes Cationicos	< 0,10	mg/L	±23%	
A Detergentes no Ionicos	< 2,00	mg/L	±17%	
* Detergentes Totales	< 0,10	mg/L	±40%	
DQO	< 20,0	mg/L O2	±14%	
pH	7,79		±5%	
Sólidos en Suspensión	2,22	mg/L	±31%	
<b>Formas Nitrogenadas/Fosforadas</b>				
Nitrógeno Kjeldahl	< 5,00	mg/L N	±25%	
Nitrógeno Total	< 5	mg/L	±27%	
<b>Cationes +</b>				
Amonio	< 5,00	mg/L	±13%	
<b>Aniones -</b>				
Cloruros	14,3	mg/L	±20%	
Sulfatos	12,5	mg/L	±20%	
<b>Metales Totales</b>				
*2 Boro Total	< 0,100	mg/L	-	
Fósforo Total	1,18	mg/L	±13%	

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos, marcados con (\*). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).

(2) Ensayo cubierto por la Acreditación nº TL-475 emitida por IAS.

Nº de Referencia: A-20/037545  
 Descripción(\*): EDAR FONT ROJA

Tipo Muestra: AGUA RESIDUAL  
 Fecha Fin: 26/05/2020

## ANEXO TECNICO

Parámetro	PNT	Técnica	Ref. Norma.	Rango
<b>Aniones -</b>				
Nitratos	PE-336	Analiz Flujo Segmentado		10,0 - 100.000 mg/L
<b>Parámetros Físico-Químicos</b>				
Aceites y Grasas	PE-296	Espect FTIR		1,00 - 5.000 mg/L
DBO5	PE-305	Electrometría		5,00 - 6.000 mg/L O2
Detergentes Anionicos	PE-310	Espect UV-VIS		0,10 - 200 mg/L
<sup>A</sup> Detergentes Cationicos	PS-1018	Subcontrat		0,10 - 150 mg/L
<sup>A</sup> Detergentes no Ionicos	PS-1018	Subcontrat		2,00 - 600 mg/L
* Detergentes Totales	PE-310	Espect UV-VIS		0,10 - 5.000 mg/L
DQO	PE-2032	Espect UV-VIS		20,0 - 5.000 mg/L O2
pH	PEC-001	Potenciometría pH		2,00 - 12,0
Sólidos en Suspensión	PE-307	Gravimetría		2,00 - 15.000 mg/L
<b>Formas Nitrogenadas/Fosforadas</b>				
Nitrógeno Kjeldahl	PE-341	Espect UV-VIS		5,00 - 1.000 mg/L N
Nitrógeno Total	PE-335	Anal. Elemental		5 - 10.000 mg/L
<b>Cationes +</b>				
Amonio	PE-336	Analiz Flujo Segmentado		5,00 - 5.000 mg/L
<b>Aniones -</b>				
Cloruros	PE-2090	Cromatog Iónica		0,50 - 100 mg/L
Sulfatos	PE-2090	Cromatog Iónica		0,50 - 100 mg/L
<b>Metales Totales</b>				
<sup>*2</sup> Boro Total	PE-2107	Espect ICP-OES		0,100 - 100 mg/L
Fósforo Total	PE-308	Espect ICP-OES		0,10 - 1.000 mg/L

Los parámetros marcados con asterisco (\*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditación.

## Catalá Reig, Santiago

---

**De:** Catalá Reig, Santiago  
**Enviado el:** lunes, 9 de marzo de 2020 9:17  
**Para:** lhidalgo@alcoi.org; jesusgonzalez@alcoi.org  
**CC:** etormo@alcoi.org; Serna Guirao, Matias  
**Asunto:** Trabajos realizados semana 10/2020

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 10/2020

- **Incidencias Línea Verde:** Revisadas todas las incidencias quedando pendiente la 1001353 por imposibilidad de ejecución
- **Otras incidencias:** Sin incidencias relevantes
- **Revisión y limpieza según planificación:** Finalizada revisión y limpieza de toda Zona Norte. Paralelamente a la revisión de galerías se da comienzo a Ensanche por Cotes Altas
- **Análíticas EDAR:** Sin comentarios, prevista nuevas muestras para marzo
- **Galerías visitables:** Se comienza con la revisión de galerías visitables del centro. Se ha aprovechado para desembozar varios imbornales desde abajo
- **Mantenimiento de EDAR y EBAR.** Según planificación establecida. Desbroce perimetral
- **Revisión de red de alcantarillado:** Enviada planificación semanal para aviso de cortes de calles puntuales a Policía Local
- **Cámara:** Inspección red Alcantarillado Font Roja por obra en Pistas nuevas
- **Alertas:** Sin comentarios
- **GIS:** Se presenta en Ayto al nuevo Delineante para la delegación
- **Otros:** Envío a revisión cámara robot por labores de mantenimiento

Saludos cordiales

**Santiago Catalá Reig**  
**Jefe de Explotación**

### **FCC Aqualia**

C/ Goya, 5 P.B.  
03801 Alcoy (Alicante) España  
Tel: +34 96 554 82 30 / Fax: +34 96 554 70 59  
[scatalar@fcc.es](mailto:scatalar@fcc.es)  
[www.aqualia.es](http://www.aqualia.es)

### **FCC Servicios Ciudadanos**

[www.fcc.es](http://www.fcc.es)  
@FCC\_Group

**Infraestructuras | Medio ambiente | Agua | Energía**

---

#### **Aviso de confidencialidad**

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. GRUPO FCC informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de

## Catalá Reig, Santiago

---

**De:** Catalá Reig, Santiago  
**Enviado el:** lunes, 16 de marzo de 2020 10:45  
**Para:** lhidalgo@alcoi.org; jesusgonzalez@alcoi.org  
**CC:** etormo@alcoi.org; Serna Guirao, Matias  
**Asunto:** RE: Trabajos realizados semana 11/2020

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 11/2020

- **Incidencias Línea Verde:** Revisadas todas las incidencias quedando pendiente la 1001353 por imposibilidad de ejecución
- **Otras incidencias:** Insonorización tapa pozo en C/. Barranc del Cint 32, desembozo red desagües de Albergue Canino, limpieza de imbornales parque Escultor Ridaura, revisión imbornal corrido industria Jacarilla
- **Revisión y limpieza según planificación:** Revisión y limpieza de zona Cotes Altes y parte de ensanche alto
- **Análíticas EDAR:** Sin comentarios, prevista nuevas muestras para marzo
- **Galerías visitables:** Se finaliza con la revisión de galerías visitables del centro. Se ha aprovechado para desembozar varios imbornales desde abajo
- **Mantenimiento de EDAR y EBAR.** Según planificación establecida.
- **Revisión de red de alcantarillado:** Enviada planificación semanal para aviso de cortes de calles puntuales a Policía Local
- **Cámara:** Inspección visual de la red Alcantarillado Doña Amalia por humedades en calle Alicante
- **Alertas:** Sin comentarios
- **GIS:** Se presenta en Ayto al nuevo Delineante para la delegación
- **Otros:** Envío a revisión cámara robot por labores de mantenimiento

Saludos cordiales

**Santiago Catalá Reig**  
**Jefe de Explotación**

### **FCC Aqualia**

C/ Goya, 5 P.B.  
03801 Alcoy (Alicante) España  
Tel: +34 96 554 82 30 / Fax: +34 96 554 70 59  
[scatalar@fcc.es](mailto:scatalar@fcc.es)  
[www.aqualia.es](http://www.aqualia.es)

### **FCC Servicios Ciudadanos**

[www.fcc.es](http://www.fcc.es)  
[@FCC\\_Group](#)

**Infraestructuras | Medio ambiente | Agua | Energía**

#### **Aviso de confidencialidad**

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. GRUPO FCC informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de

## Catalá Reig, Santiago

---

**De:** Catalá Reig, Santiago  
**Enviado el:** lunes, 23 de marzo de 2020 12:42  
**Para:** lhidalgo@alcoi.org; jesusgonzalez@alcoi.org  
**CC:** etormo@alcoi.org; Serna Guirao, Matias  
**Asunto:** Trabajos realizados semana 12/2020

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 12/2020

- **Incidencias Línea Verde:** Revisadas todas las incidencias quedando pendiente la 1001353 por imposibilidad de ejecución
- **Otras incidencias:** Revisión con personal Ayto de la incidencia pozo Caseta Mascarells e imbornal C/. Arzobispo Domenech (puerta colegio Esclavas)
- **Revisión y limpieza según planificación:** Revisión y limpieza de zona Cotes Altes y parte de ensanche alto. Debido a las recomendaciones se está realizando servicios mínimos con personal de guardia y retén
- **Análíticas EDAR:** Sin comentarios, prevista nuevas muestras para marzo
- **Galerías visitables:** Se finaliza con la revisión de galerías visitables del centro. Se ha aprovechado para desembozar varios imbornales desde abajo
- **Mantenimiento de EDAR y EBAR.** Según planificación establecida. La bomba de la EBAR Xorrador está dando problemas de momento sin consecuencias. Se ha tenido que ir durante toda la semana en turnos de mañana y de tarde para comprobar buen funcionamiento. El fin de semana se ha ido a realizar nuevas comprobaciones y a cambiar la boya por problemas varios
- **Revisión de red de alcantarillado:** Enviada planificación semanal para aviso de cortes de calles puntuales a Policía Local
- **Cámara:** Sin comentarios
- **Alertas:** A pesar de no existir alerta por lluvias, se han revisado todos los puntos críticos
- **GIS:** Sin comentarios
- **Otros:** Esta semana los trabajos se han centrado sobre todo en trabajos a nivel Correctivo

Saludos cordiales

**Santiago Catalá Reig**  
**Jefe de Explotación**

### **FCC Aqualia**

C/ Goya, 5 P.B.  
03801 Alcoy (Alicante) España  
Tel: +34 96 554 82 30 / Fax: +34 96 554 70 59  
[scatalar@fcc.es](mailto:scatalar@fcc.es)  
[www.aqualia.es](http://www.aqualia.es)

### **FCC Servicios Ciudadanos**

[www.fcc.es](http://www.fcc.es)  
@FCC\_Group

## Catalá Reig, Santiago

---

**De:** Catalá Reig, Santiago  
**Enviado el:** lunes, 4 de mayo de 2020 11:23  
**Para:** lhidalgo@alcoi.org; jesusgonzalez@alcoi.org  
**CC:** etormo@alcoi.org; Serna Guirao, Matias  
**Asunto:** RE: Trabajos realizados semana 13-14-15-16-17-18/2020

Buenos días:

A lo largo de estas semanas no os he enviado ningún correo de los trabajos realizados ya que debido a las circunstancias los trabajos planificados han sido paralizados en su mayoría realizándose simplemente mantenimiento a nivel correctivo.

A partir de la semana que viene y mientras dure la desescalada continuaremos con el procedimiento habitual.

De momento os hago un breve resumen de los trabajos realizados durante estas semanas:

- **Incidencias Línea Verde:** Revisadas incidencias nº 1069856, 1079753, 1080648, 1091083, 1093954, 1018901,
- **Otras incidencias:** Revisión incidencia C/. Piló, Imbornal Jacarilla, Colector Puente Cervantes extracción de Tapa de hierro, revisión alcantarillado c/. Alicante y Doña Amalia, Revisión Pare Poveda, sustitución imbornal C/. San Mateo 8, revisión y limpieza obra Santo Tomás, limpieza puente guitarrista J.L. González, limpieza y revisión imbornales pasarela Romeral/Paulas
- **Revisión y limpieza según planificación:** Debido a las recomendaciones se han estado realizando servicios mínimos con personal de guardia y retén
- **Analíticas EDAR:** Recogidas muestras de marzo pendiente de recibir informe de resultados
- **Galerías visitables:** Sin comentarios
- **Mantenimiento de EDAR y EBAR.** Según planificación establecida.
- **Cámara:** Cámara pértiga imbornal Jacarilla, revisión alcantarillado c/. Alicante y Doña Amalia, inspección Severino Albarracín nº 20, C/. Pare Poveda,
- **Alertas:** Ha habido varias alertas por lluvias, se han revisado todos los puntos críticos
- **GIS:** Se están realizando los trabajos de cartografía
- **Otros:** Estas semanas los trabajos se han centrado sobre todo en trabajos a nivel Correctivo

Saludos cordiales

**Santiago Catalá Reig**  
**Jefe de Explotación**

### **FCC Aqualia**

C/ Goya, 5 P.B.  
03801 Alcoy (Alicante) España  
Tel: +34 96 554 82 30 / Fax: +34 96 554 70 59  
[scatalar@fcc.es](mailto:scatalar@fcc.es)  
[www.aqualia.es](http://www.aqualia.es)

**FCC Servicios Ciudadanos**

## Catalá Reig, Santiago

---

**De:** Catalá Reig, Santiago  
**Enviado el:** lunes, 11 de mayo de 2020 10:42  
**Para:** lhidalgo@alcoi.org; jesusgonzalez@alcoi.org  
**CC:** etormo@alcoi.org; Serna Guirao, Matias  
**Asunto:** Trabajos realizados semana 19/2020

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 19/2020

- **Incidencias Línea Verde:** Revisadas todas las incidencias (109358, 1001353)
- **Otras incidencias:** Revisión imbornal y alcantarillado Plaza Xiques y Piló, revisión imbornal fuente viaducto, revisión pozos Ctra. Molinar
- **Revisión y limpieza según planificación:** Revisión y limpieza de zona Ensanche según planificación (Pintor Cabrera, Entenza y Alameda entre otros)
- **Analíticas EDAR:** A esperas de recibir resultados del último envío
- **Galerías visitables:** Sin comentarios
- **Mantenimiento de EDAR y EBAR.** Según planificación establecida.
- **Revisión de red de alcantarillado:** Previsto enviar planificación semanal para aviso de cortes de calles puntuales a Policía Local a partir del próximo viernes 15/05/20
- **Cámara:** Se pasa cámara por alcantarillado C/. Piló, C/. Asegador, Avda. de Elche, C/. Pare Poveda y colindantes
- **Alertas:** Sin comentarios
- **GIS:** Cartografiado según planificación
- **Otros:** Se ha confeccionado una relación de puntos para ser revisados por empresa externa (Juanjo Rodes), se ha revisado y limpiado por final de obra de C/. Santo Tomás y se ha revisado y limpiado C/. Terrassa después de obra dado el visto bueno para su recepción

Saludos cordiales

**Santiago Catalá Reig**  
**Jefe de Explotación**

**FCC Aqualia**

C/ Goya, 5 P.B.  
03801 Alcoy (Alicante) España  
Tel: +34 96 554 82 30 / Fax: +34 96 554 70 59  
[scatalar@fcc.es](mailto:scatalar@fcc.es)  
[www.aqualia.es](http://www.aqualia.es)

**FCC Servicios Ciudadanos**

[www.fcc.es](http://www.fcc.es)  
[@FCC\\_Group](#)

**Infraestructuras | Medio ambiente | Agua | Energía**

**Aviso de confidencialidad**

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. GRUPO FCC informa a quien pueda

## Catalá Reig, Santiago

---

**De:** Catalá Reig, Santiago  
**Enviado el:** lunes, 18 de mayo de 2020 10:55  
**Para:** lhidalgo@alcoi.org; jesusgonzalez@alcoi.org  
**CC:** etormo@alcoi.org; Serna Guirao, Matias  
**Asunto:** Trabajos realizados semana 20/2020

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 20/2020

- **Incidencias Línea Verde:** Revisadas todas las incidencias
- **Otras incidencias:** Insonorización tapa registro C/. maestro Espí, Limpieza imbornal C/. Escultor Peresejo, Limpieza imbornal C/. Vistabella, retirada tapa de C/. Pare Poveda, revisión e insonorización pozos C/. Entenza 101 y 103
- **Revisión y limpieza según planificación:** Revisión y limpieza de zona Ensanche según planificación
- **Analíticas EDAR:** A esperas de recibir resultados del último envío
- **Galerías visitables:** Sin comentarios
- **Mantenimiento de EDAR y EBAR.** Según planificación establecida.
- **Revisión de red de alcantarillado:** Enviada planificación semanal para aviso de cortes de calles puntuales a Policía Local
- **Cámara:** Se pasa cámara por alcantarillado Avda Elche por obra de Mercadona Rotonda Sur
- **Alertas:** Alerta amarilla por lluvias torrenciales para el fin de semana
- **GIS:** Cartografiado según planificación
- **Otros:** Trabajo de colaboración colocación y llenado de agua New Jersey durante dos turnos completos, trabajos de inspección en barrio de San Pancraccio por proyecto de reurbanización, trabajos de búsqueda de pozos ocultos en rotonda sur, revisión puntos críticos

Saludos cordiales

**Santiago Catalá Reig**  
**Jefe de Explotación**

### **FCC Aqualia**

C/ Goya, 5 P.B.  
03801 Alcoy (Alicante) España  
Tel: +34 96 554 82 30 / Fax: +34 96 554 70 59  
[scatalar@fcc.es](mailto:scatalar@fcc.es)  
[www.aqualia.es](http://www.aqualia.es)

### **FCC Servicios Ciudadanos**

[www.fcc.es](http://www.fcc.es)  
[@FCC\\_Group](#)

**Infraestructuras | Medio ambiente | Agua | Energía**

**Aviso de confidencialidad**  
Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. GRUPO FCC informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de

## Catalá Reig, Santiago

---

**De:** Catalá Reig, Santiago  
**Enviado el:** lunes, 25 de mayo de 2020 9:58  
**Para:** lhidalgo@alcoi.org; jesusgonzalez@alcoi.org  
**CC:** etormo@alcoi.org; Serna Guirao, Matias  
**Asunto:** RE: Trabajos realizados semana 21/2020

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 21/2020

- **Incidencias Línea Verde:** Revisadas todas las incidencias (1060567)
- **Otras incidencias:** Sin comentarios relevantes
- **Revisión y limpieza según planificación:** Revisión y limpieza de zona Ensanche según planificación. Previsto acabar el barrio esta semana y posteriormente comenzar con Santa Rosa
- **Análíticas EDAR:** A esperas de recibir resultados del último envío
- **Galerías visitables:** Sin comentarios. Envío de informe antiguo de la galería de Viaducto a resp. Ayto
- **Mantenimiento de EDAR y EBAR.** Según planificación establecida. Trabajos previos a colocación de bomba nueva en EBAR Xorrador (adaptación habitáculo entrada)
- **Revisión de red de alcantarillado:** Enviada planificación semanal para aviso de cortes de calles puntuales a Policía Local
- **Cámara:** Inspección con robot y cámara pértiga en barrio de San Pancraccio
- **Alertas:** Sin comentarios
- **GIS:** Cartografiado según planificación. Trabajos de investigación de conductos y pozos desconocidos
- **Otros:** Trabajos de inspección en barrio de San Pancraccio por proyecto de reurbanización, trabajos de búsqueda de pozos ocultos en rotonda sur, trabajos de inspección y limpieza de pozos por trabajos externos (Juanjo Rodes incidencias Ctra Molinar, C/. Cordeta y C/. San Nicolauet)

Saludos cordiales

**Santiago Catalá Reig**  
**Jefe de Explotación**

### FCC Aqualia

C/ Goya, 5 P.B.  
03801 Alcoy (Alicante) España  
Tel: +34 96 554 82 30 / Fax: +34 96 554 70 59  
[scatalar@fcc.es](mailto:scatalar@fcc.es)  
[www.aqualia.es](http://www.aqualia.es)

### FCC Servicios Ciudadanos

[www.fcc.es](http://www.fcc.es)  
[@FCC\\_Group](#)

Infraestructuras | Medio ambiente | Agua | Energía

#### Aviso de confidencialidad

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. GRUPO FCC informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de

## Catalá Reig, Santiago

---

**De:** Catalá Reig, Santiago  
**Enviado el:** lunes, 1 de junio de 2020 9:33  
**Para:** lhidalgo@alcoi.org; jesusgonzalez@alcoi.org  
**CC:** etormo@alcoi.org; Serna Guirao, Matias  
**Asunto:** Trabajos realizados semana 22/2020

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 22/2020

- **Incidencias Línea Verde:** Revisadas todas las incidencias (1120032 y 1120019)
- **Otras incidencias:** Se revisa la red de alcantarillado del pasaje Merita con Resp. Ayto. por restos en el interior, revisión red Cami 56 futuro parking, revisión C/. San Joan 10 por humedades y comunicado al Resp. Ayto
- **Revisión y limpieza según planificación:** Revisión y limpieza de zona Santa Rosa según planificación. Zona Ensanche acabada
- **Análíticas EDAR:** Recibidos resultados de las analíticas de las EDAR
- **Galerías visitables:** Sin comentarios.
- **Mantenimiento de EDAR y EBAR.** Según planificación establecida. Trabajos previos a colocación de bomba nueva en EBAR Xorrador. Prevista la recepción 03/06/20
- **Revisión de red de alcantarillado:** Enviada planificación semanal para aviso de cortes de calles puntuales a Policía Local
- **Cámara:** Inspección con robot y cámara pértiga en pasaje Merita y final de San Pancraccio
- **Alertas:** Sin comentarios
- **GIS:** Cartografiado según planificación. Trabajos de investigación de conductos y pozos desconocidos
- **Otros:** Sin comentarios relevantes

Saludos cordiales

**Santiago Catalá Reig**  
**Jefe de Explotación**

**FCC Aqualia**

C/ Goya, 5 P.B.  
03801 Alcoy (Alicante) España  
Tel: +34 96 554 82 30 / Fax: +34 96 554 70 59  
[scatalar@fcc.es](mailto:scatalar@fcc.es)  
[www.aqualia.es](http://www.aqualia.es)

**FCC Servicios Ciudadanos**

[www.fcc.es](http://www.fcc.es)  
@FCC\_Group

Infraestructuras | Medio ambiente | Agua | Energía

**Aviso de confidencialidad**

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. GRUPO FCC informa a quien pueda
