aqualia FCC
UTE ALCANTARILLADO ALCOI

Obres i Serveis
Ajuntament d'Alcoi

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALCOY

INFORME DE LOS TRABAJOS PLANIFICADOS EN RED DE ALCANTARILLADO Y ESTACIONES DE BOMBEO Y DEPURACIÓN DE RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE ALCOY

Septiembre-2020/ noviembre-2020

EL VÀTER MAI COM A PAPERERA
NO tovalloletes
NO oli
NO fàrmacs

1.- ANTECEDENTES 4
2.- PLANIFICACIÓN ESTABLECIDA 4
3.- SITUACIÓN ACTUAL 9
3.1.- REVISIÓN DE IMBORNALES 9
3.2.- REVISIÓN DE GALERIAS VISITABLES 11
3.3.- REVISIÓN DE POZOS 112
3.4.- REVISIÓN DE EBAR'S 13
3.5.- REVISIÓN DE EDAR'S 13
3.6.- REVISIÓN INCIDENCIAS VARIAS 15
3.7.- TRABAJOS DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO 15
3.7.1.-Acometidas asimilables a particulares 15
3.7.2.-Aliviadero Puente Cervantes. Zona S. Rosa 16
3.7.3.-Aliviadero Puente Cervantes. Zona Pais Valencia 16
3.7.4.- Averiguaciones proyectos varios 17
3.7.5.- Comprobaciones hundimientos varios 17
3.7.6.- Comprobación posibles filtraciones 18
3.7.7.- Insonorizado de tapas de alcantarillado 18
3.7.8.- Limpieza desagües fuentes ornamentales y públicas 19
3.7.9.- Limpieza imbornales parques y colegios municipales 19
3.7.10.- Cauce del rio 20
3.7.11.- Deficiencias varias para su valoración 20
3.7.12.- Trabajos por empresa especializada externa 21
3.7.13.- Trabajos colaboración obras varias 21
3.8.- TRABAJOS DE INSPECCIÓN CON CÁMARA 22
4.- INCIDENCIAS DETECTADAS 22
4.1.- IMBORNALES 23
4.2.- GALERÍAS VISITABLES 23
4.3.- PUNTOS CONFLICTIVOS 24
4.4.- POZOS 24
5.- RESIDUOS GENERADOS 26
6.- EPISODIOS DE FUERTES PRECIPITACIONES: 27
7.- PROPUESTAS DE MEJORA 28
8.- INFORMACIÓN DE INTERÉS 29
9.- ANEXOS ANALÍTICAS EDAR FONT ROJA Y ALBERGUE CANINO 30
10. ANEXOS COMUNICACIONES TRABAJOS SEMANALES 30

RESUMEN INFORME MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO

Periodo: SEPTIEMBRE 2020 – NOVIEMBRE 2020

Durante este periodo, se ha actuado en la totalidad de la Zona Centro Alto y bajo, barrio del Viaducto, Polígono Industrial de Cotes Baixes y parte del barrio de la Zona Norte, además de todos sus puentes, puntos críticos y tramos concretos de puntos por avisos varios, interviniendo en un total de **2.662 imbornales y 1.511 pozos**, **detectándose 369 incidencias en los imbornales**, habiéndose generado y tratado, **1.550 kg de residuos sólidos**. Por lo tanto, se ha realizado la totalidad de dos de los barrios del municipio de Alcoy y los Polígonos industriales incluida la revisión y limpieza de sus parques. También se ha procedido a limpiar parcialmente algunos tramos puntuales de galerías visitables.

Se han realizado las revisiones programadas de la EDAR Font Roja y Albergue Canino, EBAR Xorrador y Recinto Ferial de reciente puesta en marcha.

Se han realizado **75 intervenciones**, en distintos puntos de la red de alcantarillado, por avisos de ciudadanos a través del canal de la Línea Verde u otros canales, estando revisadas el 100% de las incidencias comunicadas, quedando a fecha de hoy 0% pendientes.

Durante este periodo, se han realizado diferentes inspecciones con cámara (robot y cámara pértiga) en la red de alcantarillado de Alcoy tanto planificadas como debido a incidencias, habiéndose **inspeccionado un total de 475 metros** de red de alcantarillado.

Obres i Serveis
Ajuntament d'Alcoi

Se ha superado en la semana 36 y 48 (alertas amarillas), episodios de lluvias y tormentas sin incidencias relevantes, lo que demuestra la calidad y eficiencia de los trabajos de mantenimiento, realizados en la red de saneamiento. Existe para ello un Protocolo de actuación en caso de alertas por episodios de fuertes lluvias.

Se dispone de AUTORIZACIÓN de descarga de residuos en las diferentes EDAR públicas de la Comunidad Valenciana por parte de la EPSAR habiendo sido utilizado en varias ocasiones para su descarga.

En noviembre se ha realizado la entrega de la información relativa a Cartografía Digital de las infraestructuras de los servicios de alcantarillado y el Plan Director de la red de saneamiento del municipio de Alcoy

Podemos mejorar el funcionamiento de la red de saneamiento, haciendo llegar a los usuarios un mensaje de: concienciación ciudadana y del sector de restauración para evitar vertido de aceites y grasas al alcantarillado.

1.- ANTECEDENTES

El presente informe periódico surge ante la solicitud por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de Alcoy a través del Departamento de Inspección General de Servicios, según Pliego, de los trabajos planificados en la red de alcantarillado y estaciones de bombeo y residuales en el municipio de Alcoy

En dicho informe se recogen una serie de actuaciones planificadas en dicha red, tanto en revisión de imbornales, revisión de galerías visitables, revisión de pozos, estaciones de bombeo y residuales y actuaciones puntuales según avisos de Línea Verde o a petición del Ayuntamiento a través del departamento de I.G.S. En este caso desde los meses de **septiembre de 2020 a noviembre de 2020**

Aparecen también una serie de mejoras que pueden contribuir a dar un paso más allá para la óptima gestión del Servicio Municipal de Alcantarillado de Alcoy.

A continuación se presentará una breve descripción de las actuaciones para que se establezca la viabilidad y prioridad de su ejecución y la financiación necesaria.

2.- PLANIFICACIÓN ESTABLECIDA

A continuación adjuntamos planificación establecida tanto para para la revisión de la red de alcantarillado como para las estaciones de bombeo (EBAR) y depuración de residuales (EDAR).

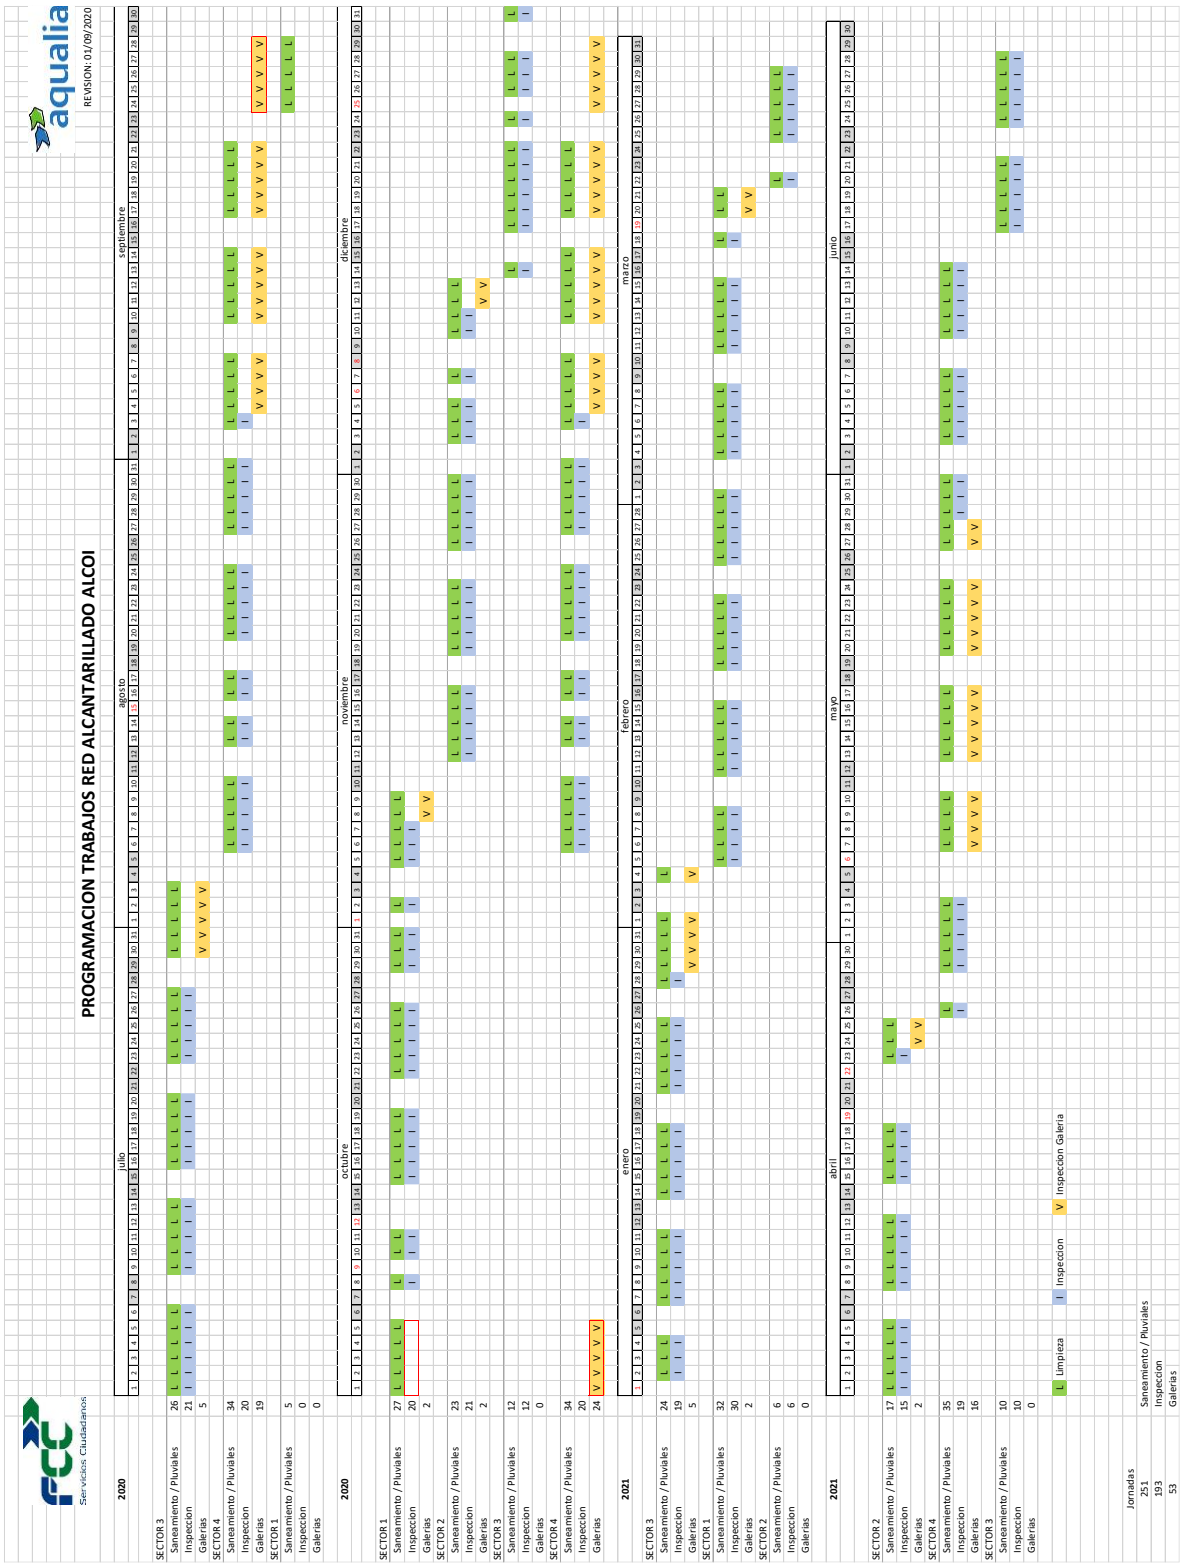

EL VÀTER MAI COM A PAPERERA
NO tovalloletes
NO oli
NO fàrmacs

UTE ALCANTARILLADO ALCOY

aqualia

PLAN DE MANTENIMIENTO E.B.A.R. ALCOY 2020

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	Mes	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
ACTUACIÓN	Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Comprobación ruidos anormales en bomba y motor	Trimestral																																																		
Comprobación parámetros eléctricos del motor: tensiones de alimentación, intensidades, equilibrio fases.	Mensual																																																		
Toma de lecturas de contadores horarios y arranques	Semanal																																																		
Medida aislamiento motor (si es inferior a 1 W, revisión por servicio técnico del fabricante)	Semestral																																																		
Lubricación del motor (en función de las horas de funcionamiento del equipo y según indicaciones y con el lubricante recomendado por el fabricante)	Anual																																																		
Sustitución rodamientos del motor (en función de las horas de funcionamiento del equipo)	Anual																																																		
Revisión sistema transmisión	Trimestral																																																		
Revisión por servicio técnico del fabricante (Cada 2 a 5 años según horas de funcionamiento)	Exterior																																																		
Comprobación boyas de nivel	Mensual																																																		
Limpieza general y de cámaras	Trimestral																																																		

EL VÀTER MAI COM A PAPERERA
NO tovalloletes
NO oli
NO fàrmacs

UTE ALCANTARILLADO ALCOY

PLAN DE MANTENIMIENTO E.D.A.R. FONT ROJA ALCOY 2020

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	Mes	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
ACTUACIÓN	Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Tamiz: Comprobación reja gruesos	Semanal																																																	
Tamiz: Revisión tornillo trasportador	Semanal																																																
Tamiz: Engrase rodamientos	Trimestral																																																
Tamiz: Comprobación ruidos anormales motor	Trimestral																																																
Tamiz: Pintado equipo (si procede)	Anual																																																
Tamiz: Limpieza de sólidos y retirada	Semanal																																																
Trat. Biológico: Comprobación bombas (recirculación y fangos)	Semanal																																																
Trat. Biológico: Comprobación boyas nivel	Semanal																																																
Trat. Biológico: Comprobación estado reactor de biodiscos.	Semanal																																																
Arqueta de salida: Comprobación y limpieza	Mensual																																																
Cuadro eléctrico: Revisión cuadro eléctrico y protecciones	Trimestral																																																
Cuadro eléctrico: Inspección oficial por OCA (Si procede)	Servicio Externo																																																
Limpieza general (zona de trabajo y perímetro)	Mensual																																																

EL VÀTER MAI COM A PAPERERA
NO tovalloletes
NO oli
NO fàrmacs

UTE ALCANTARILLADO ALCOY

aqualia

PLAN DE MANTENIMIENTO E.D.A.R. ALB. CANINO ALCOY 2020

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO	Mes	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
ACTUACIÓN	Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Tamiz: Comprobación estado cepillos arrastre	Semanal																																																		
Tamiz: Revisión cadena transmisión	Trimestral																																																	
Tamiz: Engrase rodamientos	Trimestral																																																	
Tamiz: Comprobación ruidos anormales motor	Mensual																																																	
Tamiz: Pintado equipo (si procede)	Anual																																																	
Tamiz: Limpieza de sólidos y retirada	Semanal																																																	
Trat. Biológico: Comprobación bombas (recirculación y fangos)	Semanal																																																	
Trat. Biológico: Comprobación boyas nivel	Semanal																																																	
Trat. Biológico: Comprobación ventilación. Limpieza incrustaciones y engrase	Trimestral																																																	
Arqueta de salida: Comprobación y limpieza	Trimestral																																																	
Arqueta contador: Comprobación estado contador salida	Mensual																																																	
Cuadro eléctrico: Revisión cuadro eléctrico y protecciones	Trimestral																																																	
Cuadro eléctrico: Inspección oficial por OCA (Si procede)	Servicio externo																																																	
Limpieza general (zona de trabajo y perímetro)	Mensual																																																	

EL VÀTER MAI COM A PAPERERA
NO tovalloletes
NO oli
NO fàrmacs

3.- SITUACIÓN ACTUAL

A continuación detallamos los trabajos realizados entre los meses de **septiembre de 2020 a noviembre de 2020** en todas las instalaciones:

3.1.- REVISIÓN DE IMBORNALES

Entre las fechas indicadas se han revisado un total de **2.662 imbornales** habiéndose realizado:

- Zona Centro Alto
- Zona Centro Bajo
- Zona Viaducto
- Zona Pol. Ind. Cotes Baixes
- Zona Norte (parcial)
- Todos sus puentes
- Punto críticos

Paralelamente se procede a la revisión y limpieza de:

- Todos los parques de las diferentes zonas
- Entorno Fuentes Ornamentales

Adjuntamos cronograma de la situación de la revisión de imbornales en este periodo de tiempo:

EL VÀTER MAI COM A PAPERERA
NO tovalloletes
NO oli
NO fàrmacs

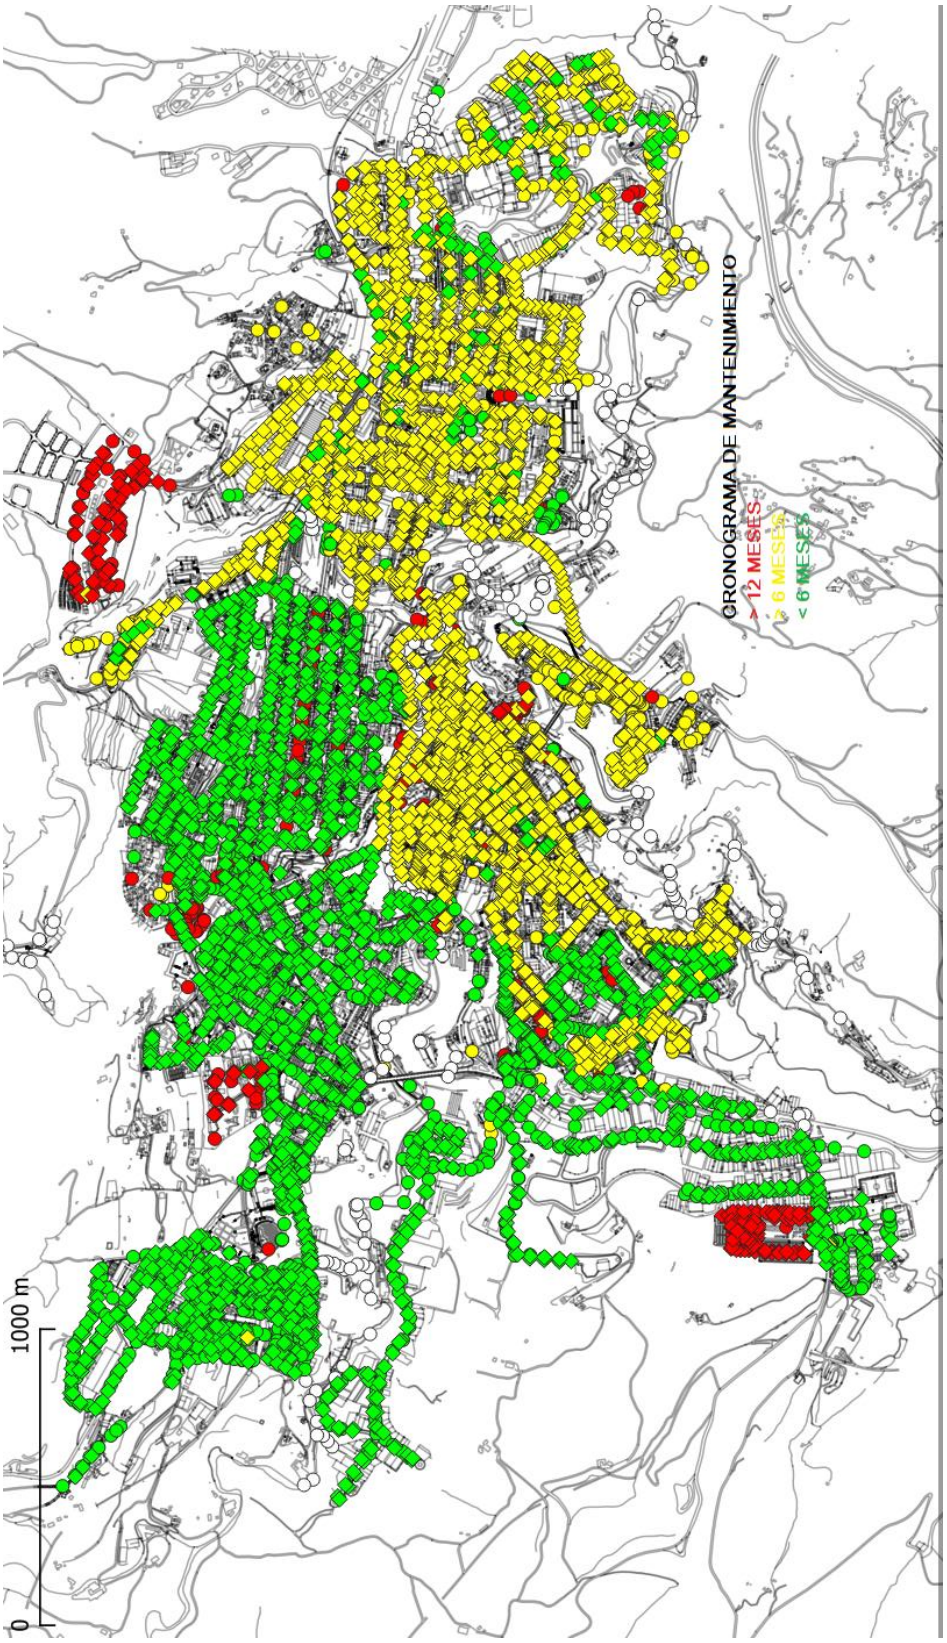

EL VÀTER MAI COM A PAPERERA
NO tovalloletes
NO oli
NO fàrmacs

Ej. Revisión y limpieza de imbornales

3.2.- REVISIÓN DE GALERIAS VISITABLES

Entre las fechas indicadas y debido a las circunstancias del confinamiento no se ha podido realizar la totalidad de la revisión de galerías dentro de la planificación establecida.

Ej. Galería visitable M. J. Ribera Montes. Revisión

3.3.- REVISIÓN DE POZOS

Entre las fechas indicadas se han revisado un total de **1.511 pozos** de las mismas zonas indicadas en el apartado de imbornales incluidos parques y jardines.

Ej. Revisión y limpieza pozo. Toallitas

EL VÀTER MAI COM A PAPERERA
NO tovalloletes
NO oli
NO fàrmacs

3.4.- REVISIÓN DE EBAR'S

Se ha realizado la revisión siguiendo la planificación establecida. Se ha enviado a reparar la bomba averiada en EBAR Xorrador y se ha puesto en marcha la bomba de la EBAR Recinto Ferial

Instalación nueva bomba EBAR Recinto Ferial

3.5.- REVISIÓN DE EDAR'S

Se ha realizado la revisión de las EDAR de Font Roja y Albergue Canino siguiendo la planificación establecida.

3.5.1 EDAR ALBERGUE CANINO:

- Sin incidencias relevantes.

EL VÀTER MAI COM A PAPERERA
NO tovalloletes
NO oli
NO fàrmacs

Revisión automatismos cuadro eléctrico. Labor de mantenimiento

3.5.1 EDAR FONT ROJA:

- Sin incidencias relevantes.

Revisión EDAR Font Roja. Labor mantenimiento

EL VÀTER MAI COM A PAPERERA
NO tovalloletes
NO oli
NO fàrmacs

3.6.- REVISIÓN INCIDENCIAS VARIAS

Entre las fechas indicadas se han revisado un total de **75 incidencias** de línea verde o por otro medio de aviso, de las cuales han sido solucionadas y por lo tanto cerradas todas ellas, quedando un 0% pendientes.

3.7.- TRABAJOS DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO

Se han realizado trabajos de colaboración con el Ayuntamiento en varias incidencias entre ellas las que citamos a continuación por su relevancia:

3.7.1.-Acometidas asimilables a particulares

Se ha realizado la revisión de la red de alcantarillado de varias acometidas particulares para descartar cualquier incidencia que sea responsabilidad de la red de alcantarillado del municipio de Alcoy (Ejem: Cabalero Merita, Carrascar, San José, Mc Donadls, Espronceda, Mirasierra, San Pancracio, etc)

Ejem: Acometida particular con obstrucción

EL VÀTER MAI COM A PAPERERA
NO tovalloletes
NO oli
NO fàrmacs

3.7.2.-Aliviadero Puente Cervantes zona Santa Rosa:

Debido a las últimas lluvias el pozo ha sido de nuevo arrastrado por lo que debe ser nuevamente reconstruido. Se realizan revisiones periódicas en colaboración con el Ayuntamiento.

Estado actual del pozo

3.7.3.- Aliviadero Puente Cervantes zona Pais Valencia:

Debido a las últimas lluvias se han arrastrado gran cantidad de piedras y otros restos lo que provoca obstrucciones debido al gran número de toallitas que se tiran. De momento ha sido resuelto puntualmente pero se requiere una inspección más exhaustiva de toda la red de alcantarillado

Ejem: Restos arrastrados que se depositan en el pozo

EL VÀTER MAI COM A PAPERERA
NO tovalloletes
NO oli
NO fàrmacs

3.7.4.-Averiguaciones proyectos varios

Trabajos de colaboración con el personal del Ayto para averiguación estado red alcantarillado en barrio Clots, manzana de Rodes y barrio San Pancracio

Ejem: Estado pozo San Pancracio

3.7.5.- Comprobación hundimientos varios

Se ha actuado en varias ocasiones en colaboración con las brigadas municipales para comprobar posible relación de la red de alcantarillado con hundimientos en la calle Cami, Cid, Encaro, y San Juan de Ribera, descartándose en todos los casos.

Ejem: Hundimiento C/. Cid

EL VÀTER MAI COM A PAPERERA
NO tovalloletes
NO oli
NO fàrmacs

3.7.6.- Comprobación posibles filtraciones

Se ha actuado en varias ocasiones en colaboración con las brigadas municipales para averiguar posible relación de la red de alcantarillado con problemas de filtraciones como por ejemplo en la C/.Espronceda o La riba, actuando sobre un pozo de ésta última para descartar la causa de las mismas.

Ejem: Pozo a impermeabilizar en C/. La Riba nº 20.

3.7.7.- Insonorizado de tapas de alcantarillado

Se han ido insonorizando un total de 10 tapas de alcantarillado en este periodo, que debido a su instalación hacen ruido por el tráfico rodado.

Ejem: Insonorización tapa pozo C/. Font de Mariola

EL VÀTER MAI COM A PAPERERA
NO tovalloletes
NO oli
NO fàrmacs

3.7.8.- Limpieza desagües fuentes ornamentales y públicas

Se ha realizado la revisión y limpieza de fuentes públicas (Font del Pontet, Vía Verde Batoi)

Ejem: Revisión y limpieza Font pontet

3.7.9.- Limpieza imbornales parques y colegios municipales

Se ha realizado la revisión y limpieza de todos los parques de la Zona planificada de forma más minuciosa y siguiendo la planificación establecida. (Parque Batoi, Parque Cantagallet, Parque Viaducto

Ejem: Trabajos de desatasco Imbornal corrido en parque Viaducto

EL VÀTER MAI COM A PAPERERA
NO tovalloletes
NO oli
NO fàrmacs

Ejem: Parque romeral

3.7.10.- Cauce del rio

Se ha colaborado con el Ayuntamiento y la EDAR en la revisión de diferentes tramos del río por posibles vertidos

Ejem: Aviso posible vertido al cauce del rio

3.7.11.- Deficiencias varias para su valoración

Se ha colaborado con el Ayuntamiento en la revisión, limpieza e inspección con cámara de varios tramos de la red de alcantarillado de distintos puntos de la población para su valoración y posterior reparación. Muchos de ellos ya han sido resueltos como por ejemplo C/. Azorín, C/. Carmen Vidal, Partida Pagos, etc.

Desprendimiento en red alcantarillado C/. Azorín resuelto

3.7.12.- Trabajos por empresa especializada externa

Se ha colaborado con el Ayuntamiento en la revisión y limpieza de puntos que tienen deficiencias en su interior y que debido a la complejidad de los trabajos se ha requerido de una empresa especializada. Está prevista otra intervención en diciembre.

Ejem: Restos pozo que requieren trabajos especializados

3.7.13.- Trabajos colaboración obras varias

Se ha colaborado con el Ayto de Alcoy en la revisión y verificación de los trabajos realizados en diferentes obras de mejora realizada. Ejem: C/. Tints, Partida de Pgos, Avda Hispanidad, Molinar, Clots, Juzgados, San Francisco, etc.

Ejem: mejora pozo Avda. hispanidad

3.8.- TRABAJOS DE INSPECCIÓN CON CÁMARA

A lo largo de estos meses se han realizado diferentes inspecciones en la red de alcantarillado de Alcoy tanto planificadas como debido a incidencias habiéndose inspeccionado un total de **475 m de red de alcantarillado.**

Inspección con Cámara. Calle Sotarroni

4.- **INCIDENCIAS DETECTADAS**

4.1.- IMBORNALES

INCIDENCIA	Nº IMBORNALES AFECTADOS	OBSERVACIONES
ACOMETIDA RAICES	52	
ACOMETIDA ROTA	1	
ACOM. TAPON/NO CONECT	52	
CAJA DEFECTUOSA	4	
COMPROBAR GIS	133	No existen
ACOMETIDA ANULADA	0	
MARCO ROTO	14	
MARCO SUELTO	27	
SIFON HORMIGONADO	0	
SIFON ROTO	25	
SIFON SIN TAPA	2	
TAPA ROTA	25	
TAPA SIN	1	Sustituidas varias tapas de imbornales o mejoradas.
TAPA SOLDADA	11	
TAPADO ASFALTO	4	
ACOM. DESAGUE REDUCIDO	5	
SIN ACCESO	13	Pte. Limpieza por diferentes motivos

4.2.- GALERÍAS VISITABLES

Siguen estando en fase de resolución por parte del Ayuntamiento, las anomalías en las galerías visitables revisadas y anotadas en anteriores informes, ya que pueden suponer un posible riesgo para la seguridad del personal de mantenimiento y además dificultan las labores de revisión.

Resuelta la incidencia de la galería Visitable de Oliver.

Ej. Galería visitable Oliver. Acceso y reparación

4.3.- PUNTOS CONFLICTIVOS

Se dispone de un listado detallado de los puntos con incidencias que consideramos deben ser reparados con una orden de prioridad contrastados y revisados por el responsable del Ayuntamiento. Algunos de ellos ya hemos comentado en punto anterior que han sido resueltos

4.4.- POZOS

A lo largo de estos meses, al igual que el periodo anterior, se observa en algunos casos gran cantidad de raíces, marcos sueltos o a los que les falta material y desprendimientos pero en general están en bastante buen estado de conservación. Destacar en algunos casos haber encontrado gran cantidad de grasas y toallitas.

EL VÀTER MAI COM A PAPERERA
NO tovalloletes
NO oli
NO fàrmacs

En este periodo se continúan detectando pozos con trozos de tapas de alcantarillado rotas dentro de los mismos y grandes cascotes desprendidos, lo que impide la circulación de las aguas residuales con normalidad.

Ejem: Pozo con gran cantidad de material dentro C/. Maulets

También siguen encontrando pozos en los que se han depositado materiales de construcción como hormigón que supuestamente han sido tirados al finalizar alguna obra. Estos materiales provocan que la red de alcantarillado entre en carga parcial y los lodos pueden llegar a obstruir por completo la tubería.

Ejem: Piedras y restos en interior pozo C/. M. P. Carbonell

5.- RESIDUOS GENERADOS

Añadimos este punto en el informe ya que consideramos que es muy representativo para entender el estado en el que se encuentran todos los elementos de la red de alcantarillado.

En este periodo, se han generado una totalidad de **1550 Kg de residuos sólidos** que han sido depositados en su totalidad y de forma controlada en el Ecoparque Municipal

Ejem: Detalle de carga de gran cantidad de residuos

EL VÀTER MAI COM A PAPERERA
NO tovalloletes
NO oli
NO fàrmacs

6.- EPISODIOS DE FUERTES PRECIPITACIONES:

Queremos destacar que en los episodios de precipitaciones ocurridos en el municipio entre septiembre de 2020 y noviembre de 2020, los días:

- Semana 36/2020 (episodio de lluvia alerta amarilla)
- Semana 48/2020 (episodio de lluvia alerta amarilla)

No se ha producido ninguna incidencia de relevancia.

Se dispone de un Protocolo de actuación en caso de alertas por fuertes lluvias, en el que hay diseñado un procedimiento a seguir y un listado de puntos críticos que deben ser revisados con la máxima anterioridad para evitar al máximo los posibles daños o molestias a los ciudadanos afectados.

Territori	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES	Total
Província d'Alacant													
l'Alcoià													
Alcoi Baradello	..	2,6	123,2	86,4	56,7	42,8	0,3	6,9	11,5	5,1	51,2	..	**386,7***
Alcoi ACIF	223,6	2,4	97,4	61,4	49,0	27,4	0,8	24,4	10,8	6,2	33,6	..	**537,0***
Alcoi la Penella d'Ànima	207,5	3,2	99,2	83,0	48,2	35,0	1,2	28,5	10,8	7,2	53,0	..	**576,8***
Alcoi Pas del Benissaidó	303,2	2,6	95,4	69,4	52,2	36,8	0,8	11,8	7,4	6,2	48,2	..	**634,0***
Alcoi sant Nicolau	..	..	..	..	47,1	32,3	0,8	24,3	4,9	5,3	44,8	..	**159,5***
Alcoi Menejador	270,6	3,6	119,6	60,8	41,4	17,4	4,2	..	..	7,4	46,6	..	**571,6***
Alcoi Est. Científica Font Roja Natura UA	122,0	2,8	35,4	64,8	49,6	18,4	3,8	24,2	37,4	7,8	53,2	..	**419,4***
Alcoi IES Pare Vitòria	190,8	1,6	75,2	46,8	40,8	21,2	0,4	16,4	4,8	3,8	26,0	..	**427,8***
Alcoi PI Cotes Baixes AEMET	261,6	1,6	78,8	80,2	42,0	28,8	0,2	13,0	8,4	5,2	42,8	..	**562,6***

Fuente: https://www.avamet.org/mx-episodis.php

7.- PROPUESTAS DE MEJORA

Consideramos necesario realizar una serie de actuaciones para mejorar el servicio de alcantarillado las cuales detallamos a continuación entre otras.

- Campaña de concienciación ciudadana para evitar tirar toallitas, compresas, guantes y mascarillas al WC
- Campaña de concienciación ciudadana y sector de restauración para evitar tirar exceso de aceites y grasas al alcantarillado
- Destacar en las licencias de obra que deben protegerse los imbornales y tapas de pozos para evitar que caigan materiales de construcción en las galerías.
- Destacar en las licencias de obras que después de ejecutarse una obra que afecte al servicio de alcantarillado, debe realizarse una limpieza e inspección de la red para comprobar su buen estado de funcionamiento.
- Comunicar al responsable de la limpieza urbana que evite tirar cualquier resto en los imbornales para no obstruirlos.
- Comunicar al responsable de la limpieza urbana que en caso de Alerta o Prealerta por fuertes lluvias y sobretodo en las fechas en las que los árboles caducos pierden la hoja, se extreme la limpieza con antelación para evitar obstrucciones por hojas.
- Se debería estudiar la forma de prohibir el estacionamiento encima de pozos e imbornales para poder realizar las labores de revisión y limpieza sin dificultades
- Comunicar a la empresa de desratización que cuando levanten las tapas de pozos para colocar el veneno, deben de dejarlas en la misma posición y no quitar la goma de insonorización para evitar tener reclamaciones y trabajos posteriores para su reposición.

EL VÀTER MAI COM A PAPERERA
NO tovalloletes
NO oli
NO fàrmacs

8.- INFORMACIÓN DE INTERÉS

A pesar del elevado número de incidencias que se comunican y que deben ser atendidas con carácter prioritario, desatendiendo las labores de mantenimiento planificadas y que se ha tenido que atender a diferentes solicitudes fuera de planificación al considerarse prioritarias (Limpieza de desagües de fuentes ornamentales, limpieza de parques y jardines, limpieza de avenidas con gran complicación debido al tráfico, etc), los trabajos de mantenimiento de la red de alcantarillado se han ajustado bastante a la planificación establecida.

Según reunión mantenida con el responsable del Ayuntamiento y el Inspector de Policía Local, para agilizar los trabajos de revisión y limpieza de las calles del centro urbano y el resto de calles de un solo carril, se está pasando al departamento de Policía Local con copia al responsable del Ayuntamiento, mediante correo electrónico, una planificación semanal con todas las calles que se tiene previsto revisar y además se va a realizar una llamada al retén de Policía Local, antes y después de realizar la revisión.

Igualmente de forma semanal se realiza un resumen de los trabajos realizados para que en todo momento el personal responsable del Ayuntamiento esté informado de los avances y asuntos de interés.

Continuamos realizando una labor de revisión y limpieza exhaustiva para contribuir a una optimización del Servicio Municipal de Alcantarillado de Alcoy, mejorando su funcionamiento y evitando malestar a los ciudadanos.

Firmado digitalmente
por Matias Serna Guirao
Fecha: 2021.01.29
10:35:33 +01'00'

Alcoy, diciembre 2020

EL VÀTER MAI COM A PAPERERA
NO tovalloletes
NO oli
NO fàrmacs

9.- ANEXOS ANALÍTICAS EDAR FONT ROJA Y ALBERGUE CANINO

Las analíticas se realizan de forma bimestral

10. ANEXOS COMUNICACIONES TRABAJOS SEMANALES

Se adjuntan todos los partes semanales enviados al personal responsable del Ayuntamiento de Alcoy, vía correo electrónico.

INFORME DE ENSAYO

ENAC ENSAYOS Nº 305 LE 1322/LE 1323

Los ensayos marcados con (*) no están amparados por la Acreditación de ENAC

Nº de Referencia:	**A-20/096306**	Registrada en:	AGQ España	Cliente(*):	UTE ALCANTARILLADO ALCOY
Análisis:	134861A-2	Centro Análisis:	AGQ España	Domicilio (*):	C/ Goya 5 PB
Tipo Muestra:	AGUA RESIDUAL	Fecha Recepción:	10/09/2020	Contrato:	SE20-0188
Fecha Inicio:	10/09/2020	Fecha Fin:	07/10/2020	Cliente 3º(*):	----
Descripción(*):	EDAR ALBERGUE CANINO				

Fecha/Hora Muestreo:	09/09/2020	Muestreado por:	Cliente (*)

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

M ª Jesus Gutierrez Solis

FECHA EMISIÓN: 07/10/2020

OBSERVACIONES (*):

Muestra de volumen 3l. en bote de PET y 1l. en vidrio.Detergentes Cationicos y Detergentes No Ionicos cubiertos por la acreditación ENAC Nº 229/LE1409

Labs & Technological Services AGQ, S.L.
A-8013, km. 20.8 41220 Burguillos. Sevilla. España T: (+34) 955 738 908 F: (+34) 955 738 912 atencioncliente.esp@agqlabs.com agqlabs.es

INFORME DE ENSAYO

AGQ Labs

ilac-MRA ENAC ENSAYOS Nº 305/LE 1322/LE 1323

Los ensayos marcados con (*) no están amparados por la Acreditación de ENAC

Nº de Referencia:	A-20/096306	Tipo Muestra:	AGUA RESIDUAL
Descripción(*):	EDAR ALBERGUE CANINO	Fecha Fin:	07/10/2020

RESULTADOS ANALITICOS

	Parámetro	Resultado	Unidades	Incert	CMA
	Parámetros Físico-Químicos				
	Aceites y Grasas	< 1,00	mg/L	±30%	
	DBO5	6,45	mg/L O2	±27%	
	Detergentes Anionicos	< 0,10	mg/L	±29%	
A	Detergentes Cationicos	< 0,10	mg/L	±23%	
A	Detergentes no Ionicos	< 2,00	mg/L	±17%	
*	Detergentes Totales	< 0,10	mg/L	±40%	
	DQO	23,0	mg/L O2	±14%	
	pH	7,96		±5%	
	Sólidos en Suspensión	4,19	mg/L	±31%	
	Formas Nitrogenadas/Fosforadas				
	Nitrógeno Kjeldahl	< 5,00	mg/L N	±25%	
	Nitrógeno Total	< 5	mg/L	±27%	
	Cationes +				
	Amonio	< 5,00	mg/L	±13%	
	Aniones -				
	Cloruros	11,7	mg/L	±20%	
	Nitratos	< 10,0	mg/L	±10%	
	Sulfatos	7,90	mg/L	±20%	
	Metales Totales				
	Boro Total	< 0,100	mg/L	±24%	
	Fósforo Total	0,99	mg/L	±13%	

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos, marcados con (*). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).

(1) Parametro accreditado por ENAC Nº 305

Labs & Technological Services AGQ, S.L.
A-8013, km. 20.8 41220 Burguillos. Sevilla. España T: (+34) 955 738 908 F: (+34) 955 738 912 atencioncliente.esp@agqlabs.com agqlabs.es

Nº de Referencia:	A-20/096306	Tipo Muestra:	AGUA RESIDUAL
Descripción(*):	EDAR ALBERGUE CANINO	Fecha Fin:	07/10/2020

ANEXO TECNICO

	Parámetro	PNT	Técnica	Ref. Norma.	Lim Cuantif/ Detec (1)
	Parámetros Físico-Químicos				
	Aceites y Grasas	PE-296	Espect FTIR		1,00 - 5.000 mg/L
	DBO5	PE-305	Electrometría		5,00 - 6.000 mg/L O2
	Detergentes Anionicos	PE-310	Espect UV-VIS		0,10 - 200 mg/L
A	Detergentes Cationicos	PS-1018	Espect UV-VIS		0,10 - 150 mg/L
A	Detergentes no Ionicos	PS-1018	Espect UV-VIS		2,00 - 600 mg/L
*	Detergentes Totales	PE-310	Espect UV-VIS		0,10 - 5.000 mg/L
	DQO	PE-2032	Espect UV-VIS		20,0 - 5.000 mg/L O2
	pH	PEC-001	Potenciometría pH		2,00 - 12,0
	Sólidos en Suspensión	PE-307	Gravimetría		2,00 - 15.000 mg/L
	Formas Nitrogenadas/Fosforadas				
	Nitrógeno Kjeldahl	PE-341	Espect UV-VIS		5,00 - 1.000 mg/L N
	Nitrógeno Total	PE-335	Calculado		5 - 10.000 mg/L
	Cationes +				
	Amonio	PE-336	Analizador de Flujo Continuo Segmentado		5,00 - 5.000 mg/L
	Aniones -				
	Cloruros	PE-2090	Cromatog Iónica		0,50 - 100 mg/L
	Nitratos	PE-336	Analiz Flujo Segmentado		10,0 - 100.000 mg/L
	Sulfatos	PE-2090	Cromatog Iónica		0,50 - 100 mg/L
	Metales Totales				
	Boro Total	PE-2107	Espect ICP-OES		0,100 - 100 mg/L
	Fósforo Total	PE-308	Espect ICP-OES		0,10 - 1.000 mg/L

Los parámetros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditación.

(1) El Lim Cuantif es el valor a partir del cual cuantificamos. El Lim Detecc es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitativos).Para los parámetros de Radioactividad es el MID

INFORME DE ENSAYO

AGQ Labs

ilac-MRA ENAC ENSAYOS Nº 305/LE 1322/LE 1323

Los ensayos marcados con (*) no están amparados por la Acreditación de ENAC

Nº de Referencia:	**A-20/096307**	Registrada en:	AGQ España	Cliente(*):	UTE ALCANTARILLADO ALCOY
Análisis:	134861A-2	Centro Análisis:	AGQ España	Domicilio (*):	C/ Goya 5 PB
Tipo Muestra:	AGUA RESIDUAL	Fecha Recepción:	10/09/2020	Contrato:	SE20-0188
Fecha Inicio:	10/09/2020	Fecha Fin:	07/10/2020	Cliente 3º(*):	----
Descripción(*):	EDAR FONT ROJA				

Fecha/Hora Muestreo:	09/09/2020	Muestreado por:	Cliente (*)

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

M ª Jesus Gutierrez Solis

FECHA EMISIÓN: 07/10/2020

OBSERVACIONES (*):

Muestra de volumen 3l. en bote de PET y 1l. en vidrio.Detergentes Cationicos y Detergentes No Ionicos cubiertos por la acreditación ENAC Nº 229/LE1409

INFORME DE ENSAYO

AGQ Labs

ilac-MRA ENAC ENSAYOS Nº 305 LE 1322/LE 1323

Los ensayos marcados con (*) no están amparados por la Acreditación de ENAC

Nº de Referencia:	A-20/096307	Tipo Muestra:	AGUA RESIDUAL
Descripción(*):	EDAR FONT ROJA	Fecha Fin:	07/10/2020

RESULTADOS ANALITICOS

	Parámetro	Resultado	Unidades	Incert	CMA
	Parámetros Físico-Químicos				
	Aceites y Grasas	< 1,00	mg/L	±30%	
	DBO5	8,46	mg/L O2	±27%	
	Detergentes Anionicos	< 0,10	mg/L	±29%	
A	Detergentes Cationicos	< 0,10	mg/L	±23%	
A	Detergentes no Ionicos	< 2,00	mg/L	±17%	
*	Detergentes Totales	< 0,10	mg/L	±40%	
	DQO	47,0	mg/L O2	±14%	
	pH	7,47		±5%	
	Sólidos en Suspensión	4,30	mg/L	±31%	
	Formas Nitrogenadas/Fosforadas				
	Nitrógeno Kjeldahl	< 5,00	mg/L N	±25%	
	Nitrógeno Total	22	mg/L	±27%	
	Cationes +				
	Amonio	< 5,00	mg/L	±13%	
	Aniones -				
	Cloruros	73,3	mg/L	±20%	
	Nitratos	97,0	mg/L	±10%	
	Sulfatos	20,0	mg/L	±20%	
	Metales Totales				
	Boro Total	< 0,100	mg/L	±24%	
	Fósforo Total	7,09	mg/L	±13%	

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos, marcados con (*). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).

(1) Parametro accreditado por ENAC Nº 305

INFORME DE ENSAYO

Los ensayos marcados con (*) no están amparados por la Acreditación de ENAC

Nº de Referencia:	A-20/096307	Tipo Muestra:	AGUA RESIDUAL
Descripción(*):	EDAR FONT ROJA	Fecha Fin:	07/10/2020

ANEXO TECNICO

	Parámetro	PNT	Técnica	Ref. Norma.	Lim Cuantif/ Detec (1)
	Parámetros Físico-Químicos				
	Aceites y Grasas	PE-296	Espect FTIR		1,00 - 5.000 mg/L
	DBO5	PE-305	Electrometría		5,00 - 6.000 mg/L O2
	Detergentes Anionicos	PE-310	Espect UV-VIS		0,10 - 200 mg/L
A	Detergentes Cationicos	PS-1018	Espect UV-VIS		0,10 - 150 mg/L
A	Detergentes no Ionicos	PS-1018	Espect UV-VIS		2,00 - 600 mg/L
*	Detergentes Totales	PE-310	Espect UV-VIS		0,10 - 5.000 mg/L
	DQO	PE-2032	Espect UV-VIS		20,0 - 5.000 mg/L O2
	pH	PEC-001	Potenciometría pH		2,00 - 12,0
	Sólidos en Suspensión	PE-307	Gravimetría		2,00 - 15.000 mg/L
	Formas Nitrogenadas/Fosforadas				
	Nitrógeno Kjeldahl	PE-341	Espect UV-VIS		5,00 - 1.000 mg/L N
	Nitrógeno Total	PE-335	Calculado		5 - 10.000 mg/L
	Cationes +				
	Amonio	PE-336	Analizador de Flujo Continuo Segmentado		5,00 - 5.000 mg/L
	Aniones -				
	Cloruros	PE-2090	Cromatog Iónica		0,50 - 100 mg/L
	Nitratos	PE-336	Analiz Flujo Segmentado		10,0 - 100.000 mg/L
	Sulfatos	PE-2090	Cromatog Iónica		0,50 - 100 mg/L
	Metales Totales				
	Boro Total	PE-2107	Espect ICP-OES		0,100 - 100 mg/L
	Fósforo Total	PE-308	Espect ICP-OES		0,10 - 1.000 mg/L

Los parámetros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditación.

(1) El Lim Cuantif es el valor a partir del cual cuantificamos. El Lim Detecc es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitativos).Para los parámetros de Radioactividad es el MDD

Catalá Reig, Santiago

De: Catalá Reig, Santiago
Enviado el: lunes, 7 de septiembre de 2020 8:52
Para: llhidalgo@alcoi.org; jesusgonzalez@alcoi.org
CC: etormo@alcoi.org; Serna Guirao, Matias
Asunto: Trabajos realizados semana 36/2020

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 36/2020

- **Incidencias Línea Verde**: Revisadas todas la incidencias planificadas para esta semana
- **Otras incidencias**: Revisión imbornales y pozos bajo puente Francisco Aura extrayendo una tapa partida y vaciando de tierras los imbornales. Reposición de tapas de imbornales en parque Cantagallet (no acoplan perfectamente por lo que debe ser estudiada otra solución por parte el Ayto). Revisión con personal del Ayto de un pozo ubicado en C/. Tints que requiere desbroce para su acceso.
- **Revisión y limpieza según planificación:** Revisión y limpieza Centro Alto
- **Analíticas EDAR:** Sin comentarios
- **Galerías visitables:** Sin comentarios.
- **Mantenimiento de EDAR y EBAR**. Según planificación establecida. Solicitada nevera para envío de nuevas muestras para su análisis
- **Revisión de red de alcantarillado**: Sin comentarios
- **Cámara:** Sin comentarios
- **Alertas:** Alerta nivel amarillo por lluvias. Revisados puntos críticos
- **GIS:** Cartografiado según planificación. Trabajos de investigación de conductos y pozos desconocidos
- **Otros:** Revisión visual de todos los imbornales de la obra de pavimentación de C/. San Francisco y colindantes por aviso del Ayto

Saludos cordiales

Santiago Catalá Reig
Jefe de Explotación

FCC Aqualia
C/ Goya, 5 P.B.
03801 Alcoy (Alicante) España
Tel: +34 96 554 82 30 / Fax: +34 96 554 70 59
scatalar@fcc.es
www.aqualia.es

FCC Servicios Ciudadanos
www.fcc.es
@FCC_Group

Infraestructuras | Medio ambiente | Agua | Energía

Aviso de confidencialidad
Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. GRUPO FCC informa a quien pueda

Catalá Reig, Santiago

De: Catalá Reig, Santiago
Enviado el: lunes, 14 de septiembre de 2020 9:47
Para: llhidalgo@alcoi.org; jesusgonzalez@alcoi.org
CC: etormo@alcoi.org; Serna Guirao, Matias
Asunto: Trabajos realizados semana 37/2020

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 37/2020

- **Incidencias Línea Verde**: Revisadas todas la incidencias planificadas para esta semana quedando pendientes la nº 1245508 y 1239986 a falta de decisión por parte del Ayto.
- **Otras incidencias**: Reposición tapa imbornal en Pass del Benisaidó. Limpieza de imbornales lineales del parking de la Policía municipal, retirando más de 500 Kg de tierras y residuos de su interior. Retirada de trozos de tapa de pozo en Dtor guerau. Retirada de residuos (toallitas) en pozos de C/. Ctra Molinar
- **Revisión y limpieza según planificación:** Revisión y limpieza Centro Alto y bajo
- **Analíticas EDAR:** Enviadas muestras a laboratorio según planificación
- **Galerías visitables:** Sin comentarios.
- **Mantenimiento de EDAR y EBAR**. Según planificación establecida.
- **Revisión de red de alcantarillado**: Sin comentarios
- **Cámara:** Sin comentarios
- **Alertas:** Revisados puntos críticos por posibles lluvias sin alerta.
- **GIS:** Cartografiado según planificación. Trabajos de investigación de conductos y pozos desconocidos
- **Otros:** Comprobación buen funcionamiento imbornales en Escultor Peresejo y Carmen Vidal. Correcto. Inspección de todos los pozos e imbornales del Cementerio municipal. Correcto

Saludos cordiales

Santiago Catalá Reig
Jefe de Explotación

FCC Aqualia
C/ Goya, 5 P.B.
03801 Alcoy (Alicante) España
Tel: +34 96 554 82 30 / Fax: +34 96 554 70 59
scatalar@fcc.es
www.aqualia.es

FCC Servicios Ciudadanos
www.fcc.es
@FCC_Group

Infraestructuras | Medio ambiente | Agua | Energía

Aviso de confidencialidad
Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. GRUPO FCC informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de

Catalá Reig, Santiago

De: Catalá Reig, Santiago
Enviado el: lunes, 21 de septiembre de 2020 8:39
Para: 'llhidalgo@alcoi.org'; 'jesusgonzalez@alcoi.org'
CC: 'etormo@alcoi.org'; Serna Guirao, Matias
Asunto: Trabajos realizados semana 38/2020

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 38/2020

- **Incidencias Línea Verde**: Revisadas todas la incidencias planificadas para esta semana quedando pendientes la nº 1245508 y 1239986 a falta de decisión por parte del Ayto.

- **Otras incidencias**: Revisado el hundimiento de C/. Cami nº 34-36 descartando posible relación con el alcantarillado. Colocación de tapa de imbornal lineal en C/. M. J. Ribera Montes nº 25 al estar nuevamente suelta. Se informa al personal del Ayto para su reparación al ser peligrosa

- **Revisión y limpieza según planificación:** Revisión y limpieza Centro Bajo

- **Analíticas EDAR:** Enviadas muestras a laboratorio según planificación

- **Galerías visitables:** Prevista la revisión para semana 40

- **Mantenimiento de EDAR y EBAR**. Según planificación establecida.

- **Revisión de red de alcantarillado**: Revisión red alcantarillado barrio Clots

- **Cámara:** Revisión red alcantarillado barrio Clots

- **Alertas:** Revisados puntos críticos por posibles lluvias sin alerta.

- **GIS:** Cartografiado según planificación. Trabajos de investigación de conductos y pozos desconocidos

- **Otros:** Revisada e inspeccionada con cámara toda la influencia de la obra de Els Clots. Todo correcto. Retirada bomba averiada de la EBAR Xorrador para valoración de su reparación.

Saludos cordiales

Santiago Catalá Reig
Jefe de Explotación

FCC Aqualia
C/ Goya, 5 P.B.
03801 Alcoy (Alicante) España
Tel: +34 96 554 82 30 / Fax: +34 96 554 70 59
scatalar@fcc.es
www.aqualia.es

FCC Servicios Ciudadanos
www.fcc.es
@FCC_Group

Infraestructuras | Medio ambiente | Agua | Energía

Aviso de confidencialidad
Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. GRUPO FCC informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de

Catalá Reig, Santiago

De: Catalá Reig, Santiago
Enviado el: lunes, 28 de septiembre de 2020 10:11
Para: llhidalgo@alcoi.org; jesusgonzalez@alcoi.org
CC: etormo@alcoi.org; Serna Guirao, Matias
Asunto: Trabajos realizados semana 39/2020

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 39/2020

- **Incidencias Línea Verde**: Revisadas todas la incidencias planificadas para esta semana quedando pendientes la nº 1245508 y 1239986 a falta de decisión por parte del Ayto.

- **Otras incidencias**: Revisado e insonorizado pozo C/. M. Espí nº 29 y tapas imbornales rotas (incidencia interna), Sustitución tapa rota pozo en C/. San Juan Bosco nº 12. Revisión Pozo en C/. San Miguel nº 80 comunicado por email al resp. Ayto para su reparación. Revisión con personal del Ayto imbornal suelto en C/. M. J. Ribera Montes. Revisión pozos Santa Rosa 38 para posible insonorización. Imposible por tráfico. Intento de desembozo de Font del Pontet sin éxito. Comunicado al Ayto

- **Revisión y limpieza según planificación:** Revisión y limpieza Centro Bajo y viaducto

- **Analíticas EDAR:** Enviadas muestras a laboratorio según planificación

- **Galerías visitables:** Prevista la revisión para semana 41

- **Mantenimiento de EDAR y EBAR**. Según planificación establecida.

- **Revisión de red de alcantarillado**: Sin comentarios

- **Cámara:** Sin comentarios

- **Alertas:** Sin comentarios

- **GIS:** Cartografiado según planificación. Trabajos de investigación de conductos y pozos desconocidos

- **Otros:** Revisión EDAR Albergue Canino con experta de la empresa para proponer mejoras de la instalación. Colaboración Obra Avda. Hispanidad, eliminación tabiquillo pozo. Y en Obra Parque Batoi, absorción aguas arqueta de desagüe

Saludos cordiales

Santiago Catalá Reig
Jefe de Explotación

FCC Aqualia
C/ Goya, 5 P.B.
03801 Alcoy (Alicante) España
Tel: +34 96 554 82 30 / Fax: +34 96 554 70 59
scatalar@fcc.es
www.aqualia.es

FCC Servicios Ciudadanos
www.fcc.es
@FCC_Group

Catalá Reig, Santiago

De: Catalá Reig, Santiago
Enviado el: lunes, 5 de octubre de 2020 9:48
Para: 'llhidalgo@alcoi.org'; 'jesusgonzalez@alcoi.org'
CC: 'etormo@alcoi.org'; Serna Guirao, Matias
Asunto: Trabajos realizados semana 40/2020

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 40/2020

- **Incidencias Línea Verde**: Revisadas todas la incidencias planificadas para esta semana quedando pendientes la nº 1245508 y 1239986

- **Otras incidencias**: Colocación imbornal en C/. Monduver por rotura, revisión pozos C/. M. G. Blanes por marcos sueltos. Avisado Resp. Ayto. Revisión imbornal C/. B. J. Gallardo por estar hundido. Avisado Resp. Ayto. Insonorizada tapa pozo C/. Milagrosa 18 orden interna.

- **Revisión y limpieza según planificación:** Revisión y limpieza Centro Bajo y viaducto

- **Analíticas EDAR:** Enviadas muestras a laboratorio según planificación. Prevista recepción resultados semana 41

- **Galerías visitables:** Prevista la revisión para semana 42

- **Mantenimiento de EDAR y EBAR**. Según planificación establecida.

- **Revisión de red de alcantarillado**: Sin comentarios relevantes

- **Cámara:** Sin comentarios

- **Alertas:** Sin comentarios

- **GIS:** Cartografiado según planificación. Trabajos de investigación de conductos y pozos desconocidos

- **Otros:** Colaboración con Ayto. en desatasco fuente parque Monduver. Colaboración con Ayto. prueba de desagüe del imbornal de Romeral

Saludos cordiales

Santiago Catalá Reig
Jefe de Explotación

FCC Aqualia
C/ Goya, 5 P.B.
03801 Alcoy (Alicante) España
Tel: +34 96 554 82 30 / Fax: +34 96 554 70 59
scatalar@fcc.es
www.aqualia.es

FCC Servicios Ciudadanos
www.fcc.es
@FCC_Group

Infraestructuras | Medio ambiente | Agua | Energía

Aviso de confidencialidad
Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. GRUPO FCC informa a quien pueda

Catalá Reig, Santiago

De: Catalá Reig, Santiago
Enviado el: martes, 13 de octubre de 2020 9:46
Para: llhidalgo@alcoi.org; jesusgonzalez@alcoi.org
CC: etormo@alcoi.org; Serna Guirao, Matias
Asunto: Trabajos realizados semana 41/2020

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 41/2020

- **Incidencias Línea Verde**: Revisadas todas la incidencias planificadas para esta semana
- **Otras incidencias**: Desatasco Font Pontet Batoi. Es necesario para ello desmontar toda la fuente.
- **Revisión y limpieza según planificación:** Revisión y limpieza Zona Viaducto
- **Analíticas EDAR:** Recepción resultados analíticas. Previsto envío nuevas muestras semana 43-44
- **Galerías visitables:** Prevista la revisión para semana 43
- **Mantenimiento de EDAR y EBAR**. Según planificación establecida.
- **Revisión de red de alcantarillado**: Sin comentarios relevantes
- **Cámara:** Sin comentarios
- **Alertas:** Sin comentarios
- **GIS:** Cartografiado según planificación. Trabajos de investigación de conductos y pozos desconocidos
- **Otros:** Colaboración con Ayto. visita galería visitable Oliver por obra de mejora

Saludos cordiales

Santiago Catalá Reig
Jefe de Explotación

FCC Aqualia
C/ Goya, 5 P.B.
03801 Alcoy (Alicante) España
Tel: +34 96 554 82 30 / Fax: +34 96 554 70 59
scatalar@fcc.es
www.aqualia.es

FCC Servicios Ciudadanos
www.fcc.es
@FCC_Group

Infraestructuras | Medio ambiente | Agua | Energía

Aviso de confidencialidad
Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. GRUPO FCC informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo. Este mensaje ha sido analizado con el sistema antivirus de FCC. No obstante, no se garantiza que pueda contener un virus de nueva aparición.
Antes de imprimir este correo piense si es realmente necesario.

Catalá Reig, Santiago

De: Catalá Reig, Santiago
Enviado el: lunes, 19 de octubre de 2020 14:26
Para: llhidalgo@alcoi.org; jesusgonzalez@alcoi.org
CC: etormo@alcoi.org; Serna Guirao, Matias
Asunto: Trabajos realizados semana 42/2020

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 42/2020

- **Incidencias Línea Verde**: Revisadas todas la incidencias planificadas para esta semana
- **Otras incidencias**: Desatasco Imbornal C/. Font Petxina por orden Ayto sin nº de incidencia. Inspección visual en Colegio San Vicente por humedades. Revisión incidencia C/. San Nicolás tapa pozo ruidosa. Comunicado al Ayto
- **Revisión y limpieza según planificación:** Revisión y limpieza Zona Viaducto
- **Analíticas EDAR:** Recepción resultados analíticas. Previsto envío nuevas muestras semana 43-44
- **Galerías visitables:** Prevista la revisión para semana 43-44
- **Mantenimiento de EDAR y EBAR**. Según planificación establecida.
- **Revisión de red de alcantarillado**: Sin comentarios relevantes
- **Cámara:** Sin comentarios
- **Alertas:** Sin comentarios
- **GIS:** Cartografiado según planificación. Trabajos de investigación de conductos y pozos desconocidos
- **Otros:** Colaboración con Ayto. desatasco WC colegio Miguel Hernández. Colaboración obra galería de Oliver

Saludos cordiales

Santiago Catalá Reig
Jefe de Explotación

FCC Aqualia
C/ Goya, 5 P.B.
03801 Alcoy (Alicante) España
Tel: +34 96 554 82 30 / Fax: +34 96 554 70 59
scatalar@fcc.es
www.aqualia.es

FCC Servicios Ciudadanos
www.fcc.es
@FCC_Group

Infraestructuras | Medio ambiente | Agua | Energía

Aviso de confidencialidad
Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. GRUPO FCC informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo. Este mensaje ha sido analizado con el sistema antivirus de FCC. No obstante, no se garantiza que pueda contener un virus de nueva aparición.
Antes de imprimir este correo piense si es realmente necesario.

Catalá Reig, Santiago

De: Catalá Reig, Santiago
Enviado el: lunes, 26 de octubre de 2020 12:44
Para: llhidalgo@alcoi.org; jesusgonzalez@alcoi.org
CC: etormo@alcoi.org; Serna Guirao, Matias
Asunto: RE: Trabajos realizados semana 43/2020

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 43/2020

- **Incidencias Línea Verde**: Revisadas todas la incidencias planificadas para esta semana
- **Otras incidencias**: Humedades en C/. La Riba nº 20. Comunicado al Ayto. Extracción tapa rota en C/. Ull Moro, Limpieza imbornal C/. San Eloi (Orden interna), sustitución tapa imbornal rota C/. Bisbe Orbera nº 3 (Orden interna)
- **Revisión y limpieza según planificación:** Revisión y limpieza final Zona Viaducto y comienzo Cotes Altes y Zona Norte
- **Analíticas EDAR:** Recepción resultados analíticas. Previsto envío nuevas muestras semana 43-44
- **Galerías visitables:** Prevista la revisión para semana 43-44
- **Mantenimiento de EDAR y EBAR**. Según planificación establecida.
- **Revisión de red de alcantarillado**: Sin comentarios relevantes
- **Cámara:** Inspección cámara pértiga C/. Fontanella n 21
- **Alertas:** Sin comentarios
- **GIS:** Cartografiado según planificación. Trabajos de investigación de conductos y pozos desconocidos
- **Otros:** Colaboración con Ayto obra galería de Maestro J. R. Montes y en parque Cervantes por socavón, insonorización de varios pozos en C/. Caseta Mascarelles nº 30 y C/. Salle. Trabajo de colaboración en C/. Tap nº 8 para sacar cámara atascada

Saludos cordiales

Santiago Catalá Reig
Jefe de Explotación

FCC Aqualia
C/ Goya, 5 P.B.
03801 Alcoy (Alicante) España
Tel: +34 96 554 82 30 / Fax: +34 96 554 70 59
scatalar@fcc.es
www.aqualia.es

FCC Servicios Ciudadanos
www.fcc.es
@FCC_Group

Infraestructuras | Medio ambiente | Agua | Energía

Aviso de confidencialidad
Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. GRUPO FCC informa a quien pueda

Catalá Reig, Santiago

De: Catalá Reig, Santiago
Enviado el: martes, 3 de noviembre de 2020 9:00
Para: llhidalgo@alcoi.org; jesusgonzalez@alcoi.org
CC: etormo@alcoi.org; Serna Guirao, Matias
Asunto: Trabajos realizados semana 44/2020

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 44/2020

- **Incidencias Línea Verde**: Revisadas todas la incidencias planificadas para esta semana
- **Otras incidencias**: Humedades en Xavi motos se comprueba que el pozo está lleno y ya se ha denunciado en otras ocasiones
- **Revisión y limpieza según planificación:** Revisión y limpieza Cotes Altes, Cotes Baixes y Zona Norte
- **Analíticas EDAR:** Recepción resultados analíticas. Previsto envío nuevas muestras semana 45
- **Galerías visitables:** Sin comentarios
- **Mantenimiento de EDAR y EBAR**. Según planificación establecida.
- **Revisión de red de alcantarillado**: Sin comentarios relevantes
- **Cámara:** Sin comentarios
- **Alertas:** Sin comentarios
- **GIS:** Cartografiado según planificación. Trabajos de investigación de conductos y pozos desconocidos
- **Otros:** Sin comentarios relevantes

Saludos cordiales

Santiago Catalá Reig
Jefe de Explotación

FCC Aqualia
C/ Goya, 5 P.B.
03801 Alcoy (Alicante) España
Tel: +34 96 554 82 30 / Fax: +34 96 554 70 59
scatalar@fcc.es
www.aqualia.es

FCC Servicios Ciudadanos
www.fcc.es
@FCC_Group

Infraestructuras | Medio ambiente | Agua | Energía

Aviso de confidencialidad
Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. GRUPO FCC informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo. Este mensaje ha sido analizado con el sistema antivirus de FCC. No obstante, no se garantiza que pueda contener un virus de nueva aparición.
Antes de imprimir este correo piense si es realmente necesario.

Catalá Reig, Santiago

De: Catalá Reig, Santiago
Enviado el: lunes, 9 de noviembre de 2020 9:07
Para: llhidalgo@alcoi.org; jesusgonzalez@alcoi.org
CC: etormo@alcoi.org; Serna Guirao, Matias
Asunto: Trabajos realizados semana 45/2020

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 45/2020

- **Incidencias Línea Verde**: Revisadas todas la incidencias planificadas para esta semana
- **Otras incidencias**: comunicado DE IMBORANL EN MAL ESTADO EN c/. Font Mariola nº 1, incidencia Pare Hilario comunicada por email, Insonorización TAPA Cronista Jordán,
- **Revisión y limpieza según planificación:** Revisión y limpieza Cotes Altes, Cotes Baixes y Zona Norte
- **Analíticas EDAR:** Previsto envío nuevas muestras semana 46
- **Galerías visitables:** Sin comentarios
- **Mantenimiento de EDAR y EBAR**. Según planificación establecida.
- **Revisión de red de alcantarillado**: Sin comentarios relevantes
- **Cámara:** Revisión rutinaria de Calles varias de Batoi con cámara pértiga
- **Alertas:** Limpieza preventiva de imbornales en C/. Espejo, Font de Mariola, Afición Alcoyano
- **GIS:** Cartografiado según planificación. Trabajos de investigación de conductos y pozos desconocidos
- **Otros: O**bstrucción de fuente de Batoi Vía verde, comprobación incidencias varias enviadas por E Tormo. Verificación tapas asfaltadas en C/. Sotorroni.

Saludos cordiales

Santiago Catalá Reig
Jefe de Explotación

FCC Aqualia
C/ Goya, 5 P.B.
03801 Alcoy (Alicante) España
Tel: +34 96 554 82 30 / Fax: +34 96 554 70 59
scatalar@fcc.es
www.aqualia.es

FCC Servicios Ciudadanos
www.fcc.es
@FCC_Group

Infraestructuras | Medio ambiente | Agua | Energía

Aviso de confidencialidad
Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. GRUPO FCC informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo. Este mensaje ha sido analizado con el sistema antivirus de FCC. No obstante, no se garantiza que pueda contener un virus de nueva aparición.
Antes de imprimir este correo piense si es realmente necesario.

Catalá Reig, Santiago

De: Catalá Reig, Santiago
Enviado el: martes, 17 de noviembre de 2020 8:53
Para: 'llhidalgo@alcoi.org'; 'jesusgonzalez@alcoi.org'
CC: 'etormo@alcoi.org'; Serna Guirao, Matias
Asunto: Trabajos realizados semana 46/2020

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 46/2020

- **Incidencias Línea Verde**: Revisadas todas la incidencias planificadas para esta semana
- **Otras incidencias**: Incidencia alcantarillado interior Caballero Merita nº 11, comunicado incidencia red alcantarillado C/. C Pol. Industrial Cotes Baixes
- **Revisión y limpieza según planificación:** Revisión y limpieza Cotes Baixes y Zona Norte
- **Analíticas EDAR:** Previsto envío nuevas muestras semana 47-48. Se demora por falta de caudal en Albergue Canino debido a las obras
- **Galerías visitables:** Sin comentarios
- **Mantenimiento de EDAR y EBAR**. Según planificación establecida.
- **Revisión de red de alcantarillado**: Corte tráfico programado limpieza red C/. Ibi nº 14, revisión y limpieza tramo C/. Caballero merita nº 11
- **Cámara:** Revisión humedad muro C/. Tints con Cámara pértiga aprovechando obra contigua, inspección tramo red alcantarillado Isabel Católica con C/. Tints.
- **Alertas:** Sin comentarios
- **GIS:** Cartografiado según planificación. Trabajos de investigación de conductos y pozos desconocidos
- **Otros:** Reposición tapa imbornal interior recinto ITV, reposición tapa imbornal C/. Verge Agost nº 29, trabajos de colaboración en Obra C/. Tints, revisión pozo Partida de Pagos nº 1 aliviadero sin ser posible debido a que está lleno de maleza, trabajos de colaboración alcantarillado Guardia Civil.

Saludos cordiales

Santiago Catalá Reig
Jefe de Explotación

FCC Aqualia
C/ Goya, 5 P.B.
03801 Alcoy (Alicante) España
Tel: +34 96 554 82 30 / Fax: +34 96 554 70 59
scatalar@fcc.es
www.aqualia.es

FCC Servicios Ciudadanos
www.fcc.es
@FCC_Group

Infraestructuras | Medio ambiente | Agua | Energía

Catalá Reig, Santiago

De: Catalá Reig, Santiago
Enviado el: lunes, 23 de noviembre de 2020 13:08
Para: llhidalgo@alcoi.org; jesusgonzalez@alcoi.org
CC: etormo@alcoi.org; Serna Guirao, Matias
Asunto: Trabajos realizados semana 47/2020

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 47/2020

- **Incidencias Línea Verde**: Revisadas todas la incidencias planificadas para esta semana
- **Otras incidencias**: Incidencia alcantarillado Pol. Ind. Cotes Baixes pozos sin marco denunciado al Ayto. Revisión red alcantarillado C/. Echegaray por hundimiento en acera sin observarse anomalías
- **Revisión y limpieza según planificación:** Revisión y limpieza Cotes Baixes y Zona Norte
- **Analíticas EDAR:** Previsto envío nuevas muestras semana 48.
- **Galerías visitables:** Sin comentarios
- **Mantenimiento de EDAR y EBAR**. Según planificación establecida.
- **Revisión de red de alcantarillado**: Corte tráfico programado limpieza red C/. Maulets entera, C/. San Juan de Juanes desde Gregorio Casasempere Juan hasta Murillo
- **Cámara:** Sin comentarios. Se recomienda la revisión con cámara de C/. Maulets aunque requiere de corte de calle
- **Alertas:** Sin comentarios
- **GIS:** Presentada Cartografía y Plan Director a Ayto
- **Otros:** Revisión C/. San Juan de Ribera 36 por hundimiento. Colaboración atasco interior Colegio Escoletes sin poder resolverlo de momento. Nueva revisión pozos Vaguada por reclamación Confederación,

Saludos cordiales

Santiago Catalá Reig
Jefe de Explotación

FCC Aqualia
C/ Goya, 5 P.B.
03801 Alcoy (Alicante) España
Tel: +34 96 554 82 30 / Fax: +34 96 554 70 59
scatalar@fcc.es
www.aqualia.es

FCC Servicios Ciudadanos
www.fcc.es
@FCC_Group

Infraestructuras | Medio ambiente | Agua | Energía

Aviso de confidencialidad
Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. GRUPO FCC informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de

Catalá Reig, Santiago

De: Catalá Reig, Santiago
Enviado el: jueves, 10 de diciembre de 2020 17:33
Para: llhidalgo@alcoi.org; jesusgonzalez@alcoi.org
CC: etormo@alcoi.org; Serna Guirao, Matias
Asunto: Trabajos realizados semana 48 y 49/2020

Hola:

Adjunto resumen de los trabajos realizados durante la semana 48 y 49/2020

- **Incidencias Línea Verde**: Revisadas todas la incidencias planificadas para estas semanas
- **Otras incidencias**: Incidencia alcantarillado Pol. Ind. Cotes Baixes imbornales tapados con asfalto denunciado al Ayto. Revisión red alcantarillado C/. B nº 13A pozo con marco suelto que debe ser arreglado comunicado a Resp. Ayto
- **Revisión y limpieza según planificación:** Revisión y limpieza Cotes Baixes y Zona Norte
- **Analíticas EDAR:** Envío nuevas muestras semana 49.
- **Galerías visitables:** Sin comentarios
- **Mantenimiento de EDAR y EBAR**. Según planificación establecida. Puesta en marcha nueva bomba en estación de bombeo del Recinto Ferial
- **Revisión de red de alcantarillado**: Corte tráfico programado limpieza red C/. Maulets entera, C/. San Juan de Juanes desde Gregorio Casasempere Juan hasta Murillo
- **Cámara:** Revisión con cámara C/. Sotorroni y Canalons para averiguar pozos ocultos, no siendo posible por saltos y obstáculos en el camino. Se recomienda inspección física de empresa especializada. Revisión con cámara de todo el barrio dels Clots
- **Alertas:** Aleta amarilla semana 48 sin incidencias relevantes. Destacar el problema de las hojas en este tipo de fechas. Revisados todos los puntos críticos
- **GIS:** Presentada Cartografía y Plan Director a Ayto
- **Otros:** Revisión C/. Sotorroni y Canalons. Colaboración en embozo aseos Colegio Infantil Jesuset del Miracle. Limpieza red saneamiento pista polideportivo, revisión de colector en Ctra. Molinar para presupuesto de reparación

Saludos cordiales

Santiago Catalá Reig
Jefe de Explotación

FCC Aqualia
C/ Goya, 5 P.B.
03801 Alcoy (Alicante) España
Tel: +34 96 554 82 30 / Fax: +34 96 554 70 59
scatalar@fcc.es
www.aqualia.es

FCC Servicios Ciudadanos
www.fcc.es
@FCC_Group
